



CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

R. Simplicio Moreira, 1133
CNPJ: 09.555.019/0001-09

Exercício: 2026

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 5010350

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01	PODER LEGISLATIVO
00	CÂMARA MUNICIPAL
00.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.122.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA CÂMARA
4.4.90.51.91	OBRAS E INSTALAÇÕES

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

2.367.209,65

308.939,34

308.939,34

2.058.270,31

FICHA...: 14 DATA...: 24/07/2026 LICITAÇÃO...: 200079/25 DOCUMENTO...:

CREDOR...: CONSTRUTORA CAMPOS LTDA

CNPJ/CPF: 07.214.148/0001-78

CÓDIGO: 18315 NOTA FISCAL...: 000000000002

ENDEREÇO: R DA PAZ

CIDADE...: IMPERATRIZ

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, PRAZO DE EXECUÇÃO DE 12 MESES, PROCESSO ADM. 067/2025. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2025. CONTRATO Nº 20251201.CP.003/2025. Saldo de Contrato. Ref. NF nº 2.

9204 9999.00.00.64.40 ISS

7.414,54

TOTAL DE DESCONTOS

7.414,54

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

308.939,34

VALOR LÍQUIDO:

301.524,80

trezentos e oito mil, novecentos e trinta e nove reais e trinta e quatro centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

HEYDER JOHNN DE MENDONÇA AYRES

CONTADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

ADHEMAR ALVES DE FREITAS JUNIOR

PRESIDENTE

IRAJA PINTO DA SILVA

Fiscal de Contrato

Usuário: HEYDER JOHNN DE MENDONÇA

Imperatriz, Ma, 20 de Julho de 2026.

À
Câmara Municipal de Imperatriz-MA

SOLICITAÇÃO DE MEDIÇÃO

Senhor Presidente,

A empresa CONSTRUTORA CAMPOS LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o, nº 07.214.148/0001-78, representada neste ato pelo seu Sócio – Administrador Sr. José Wilson Ferreira Campos, portador do CPF 345.170.653-91 e RG 1437020 SSP/MA, vem por meio desta solicitar a V.S.ª, que seja autorizado a 4º (Quarta) medição dos serviço de REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, conforme contrato nº20251201 CP. 003/2025.

Na certeza da vossa atenção, reitero nossos votos de consideração e apreço.

CONSTRUTORA CAMPOS LTDA

CNPJ. 07.214.148/0001-78

José Wilson Ferreira Campos

CPF Nº 345.170.653-91

ADMINISTRADOR



Chave de Acesso da NFS-e

2105302220721414800017800000000000226076619529989

Número da NFS-e

2

Competência da NFS-e

24/07/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

24/07/2026 10:48:06

Número da DPS

10

Série da DPS

70000

Data e Hora da emissão da DPS

24/07/2026 10:48:06



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 07.214.148/0001-78	Inscrição Municipal 83347	Telefone (99) 9977-5474
Nome / Nome Empresarial CONSTRUTORA CAMPOS LTDA		E-mail construtora.campos@hotmail.com	
Endereço RUA ALAGOAS, 1480, NOVA IMPERATRIZ		Município Imperatriz - MA	CEP 65917-010
Simplex Nacional na Data de Competência Não optante		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 69.555.019/0001-09	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - CAMARA MUNICIPAL		E-mail -	
Endereço SIMPLICIO MOREIRA, 1185, CENTRO		Município Imperatriz - MA	CEP 65901-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.05.01 - Reparação, conservação e reforma de edifícios e congêneres...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Imperatriz - MA	País da Prestação -
Descrição do Serviço REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SITUADA A RUA SIMPLICIO MOREIRA Nº1185, CENTRO, CONFORME CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº0003/2025 E CONTRATO Nº20251201 CP.: 003/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 067/2025 ID, CONTRATO Nº CP003/2025 DADOS PARA PAGAMENTO :CAIXA ECONÔMICA FEDERAL:AGENCIA 0644 OPERAÇÃO 003 CONTA 5021-7			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Imperatriz - MA	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 308.939,34	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções R\$ 123.575,74	Cálculo do BM -
BC ISSQN R\$ 185.363,60	Alíquota Aplicada 4,00%	Retenção do ISSQN Retido pelo Tomador	ISSQN Apurado R\$ 7.414,54

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos
PIS - Débito Apuração Própria R\$ 3.058,50	COFINS - Débito Apuração Própria R\$ 14.087,63		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 308.939,34	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido R\$ 7.414,54
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 301.524,80

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais R\$ 9,25	Estaduais R\$ 0,00	Municipais R\$ 4,00
-----------------------------	------------------------------	-------------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSTRUTORA CAMPOS LTDA
CNPJ: 07.214.148/0001-78

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 19:31:55 do dia 24/02/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/08/2026.

Código de controle da certidão: **5E16.DDDF.F53F.B8DF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 190046/26

Data da

22/07/2026 13:20:04

Inscrição Estadual: 124033180

CPF/CNPJ: 07214148000178

Razão Social: CONSTRUTORA CAMPOS LTDA

Endereço: RUA ALAGOAS, 1480 CEP: 65917010 - NOVA IMPERATRIZ

Telefone: (99)99775474

Município: IMPERATRIZ

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 20/10/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 22/07/2026 15:05:16



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 072516/26

Data da

22/07/2026 13:21:23

Inscrição Estadual: 124033180

CPF/CNPJ: 07214148000178

Razão Social: CONSTRUTORA CAMPOS LTDA

Endereço: RUA ALAGOAS, 1480 CEP: 65917010 - NOVA IMPERATRIZ

Telefone: (99)99775474

Município: IMPERATRIZ

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 20/10/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 22/07/2026 15:06:21

**PREFEITURA DE IMPERATRIZ**
SEC. DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA-SEFAZGO

CERTIDÃO NEGATIVA	CERTIDÃO DE IMÓVEL 25.02.209.0206.000	Nº: 0025677
--------------------------	--	--------------------

Informações do Contribuinte			
CÓDIGO 100825966	NOME DO CONTRIBUINTE CONSTRUTORA CAMPOS LTDA	CPF / CNPJ 07.214.148/0001-78	
ENDEREÇO RUA ALAGOAS	NÚMERO 1480	COMPLEMENTO Próximo ao colégio Santa Luzia	BAIRRO NOVA IMPERATRIZ
NÚMERO CEP 65917010	MUNICÍPIO - UF IMPERATRIZ - MA	APTO / SALA	NOME EDIFÍCIO

Proprietário(s) do Imóvel	
CPF/CNPJ 07.214.148/0001-78	NOME DO PROPRIETÁRIO CONSTRUTORA CAMPOS

Endereço do Imóvel			
CADASTRO IMÓVEL 31797	ENDEREÇO RUA ALAGOAS, Nº 01480	COMPLEMENTO QUADRA:05 LOTE: 05 / 06 / 07 LOTEAMENTO: VILA SANT	BAIRRO SANTA RITA
NÚMERO CEP	LOTEAMENTO - QUADRA - LOTE - 05 - 5A7	MUNICÍPIO - UF IMPERATRIZ - MA	EDIFÍCIO - APTO / SALA -

Informações do Requerente		
Nº DE DOCUMENTO 24857653320	NOME DO REQUERENTE CONSTRUTORA CAMPOS LTDA	FINALIDADE
OBSERVAÇÕES		

Data de Emissão: 24/07/2026	Hora de Emissão: 14:19:51	Validade: 22/09/2026
------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do Departamento de Arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da parte interessada, devidamente inscrita nos dados acima, que se encontra em situação regular perante a Fazenda Pública Municipal de Imperatriz, não constando débitos relativos a tributos municipais, inscritos ou não em dívida ativa, até a presente data.

Reserva-se à Fazenda Municipal o direito de inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal (CTM) e prerrogativa legal estabelecida no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966.

Fica ressalvada a possibilidade da existência de débitos não abrangidos pela presente certidão, como aqueles objeto de ações judiciais em andamento ou débitos que, porventura, não tenham



... sido migrados na mudança de sistema.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SEC. DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA-SEFAZGO

CERTIDÃO NEGATIVA**Nº: 0026129****Informações do Contribuinte**

CÓDIGO 100825966	NOME DO CONTRIBUINTE CONSTRUTORA CAMPOS LTDA	CPF / CNPJ 07.214.148/0001-78
ENDEREÇO RUA ALAGOAS	NÚMERO 1480	COMPLEMENTO Próximo ao colégio Santa Luzia
NÚMERO CEP 65917010	MUNICÍPIO - UF IMPERATRIZ - MA	BAIRRO NOVA IMPERATRIZ

Informações do Requerente

Nº DE DOCUMENTO 07214148000178	NOME DO REQUERENTE CONSTRUTORA CAMPOS LTDA	FINALIDADE
	OBSERVAÇÕES	

Data de Emissão: 30/07/2026 Hora de Emissão:
11:59:12

Validade: 28/09/2026

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do Departamento de Arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da parte interessada, devidamente inscrita nos dados acima, que se encontra em situação regular perante a Fazenda Pública Municipal de Imperatriz, não constando débitos relativos a tributos municipais, inscritos ou não em dívida ativa, até a presente data.

Reserva-se à Fazenda Municipal o direito de inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal (CTM) e prerrogativa legal estabelecida no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966.

Fica ressalvada a possibilidade da existência de débitos não abrangidos pela presente certidão, como aqueles objeto de ações judiciais em andamento ou débitos que, porventura, não tenham sido migrados na mudança de sistema.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.214.148/0001-78

Razão social: CONSTRUTORA CAMPOS LTDA

Endereço: R ALAGOAS 1480 / NOVA IMPERATRIZ / IMPERATRIZ / MA / 65917-010

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/07/2026 a 10/08/2026

Certificação Número: 2026071211342024216200

Informação obtida em 22/07/2026 15:09:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA CAMPOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.214.148/0001-78

Certidão nº: 16035546/2026

Expedição: 13/03/2026, às 09:14:06

Validade: 09/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA CAMPOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.214.148/0001-78**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 10/06/2026

Nº da certidão: 12602559997

Data de validade: 10/08/2026

Código de Validação: 4faadf20c4

NOME: construtora campos ltda

CNPJ: 07.214.148/0001-78

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);

Resultado da Consulta de Certidão

CNPJ07.214.148/0001-78

Período30/07/2025 a 30/07/2026

Relação das certidões emitidas por data de emissão

Código de Controle	Tipo	Data - Hora de Emissão	Data de Validade	Situação
3004303070254524	Atividade	30/07/2025 - 13:38:03	30/07/2026	Válida
9104A40909AFABBC	Negativa	03/12/2023 - 06:39:19	03/09/2029	Expirada
A391DA8C757F35B8	Positiva com efeitos de negativa	29/12/2017 - 13:51:30	27/06/2018	Expirada
BF35.4C49.9852.7D0D	Positiva com efeitos de negativa	07/10/2016 - 12:24:09	05/04/2017	Expirada

Exibir: 5

1-5 de 5 itens

Página: 1

Expirada: A data de validade da certidão expirou. Os atos praticados entre a data de emissão e data de validade da certidão permanecem válidos.

Válida: Prazo de validade da certidão ainda não vencido. A certidão pode ser utilizada em qualquer ato em que for necessária.



Estado do
Maranhão

Certidão Negativa de Débito

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 190046/26

Data de Validade: 20/10/2026


Data de Emissão: 22/07/2026 13:20:04

Inscrição Estadual: 124033180

CPF/CNPJ: 07214148000178

Razão Social: CONSTRUTORA CAMPOS LTDA

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



Estado do Maranhão Certidão Negativa de Dívida Ativa

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 072516/26

Data de Validade: 20/10/2026

Data de Emissão: 22/07/2026 13:21:23

Inscrição Estadual: 124033180

CPF/CNPJ: 07214148000178

Razão Social: CONSTRUTORA CAMPOS LTDA

[Nova Consulta](#)

[Imprimir](#)

Desenvolvido pela Softzy/COFEC - 2009-2009

✓ Validação de Certidão de Débitos

Os documentos apresentados deverão estar em perfeito estado de conservação. Não devem ser aceitos documentos rasurados, adulterados, danificados ou ilegíveis.

Informe o número da Certidão de Débitos que encontra-se no cabeçalho do documento.

Não esqueça de conferir o status de seu documento bem como sua data de validade.

025677

Buscar Documento

🔍 Sua consulta localizou **1** documento(s).

STATUS DA CERTIDÃO	CÓD. - INSCRIÇÃO	Nº CPF/CNPJ	DATA EMIÇÃO	DATA VALIDADE
CERTIDÃO NEGATIVA	31797 - 25.02.209.0206.000 / CONSTRUTORA CAMPOS	07.214.148/0001- 78	24/07/2026	22/09/2026 - Faltam 54 dias para o vencimento.

✓ Validação de Certidão de Débitos

Os documentos apresentados deverão estar em perfeito estado de conservação. Não devem ser aceitos documentos rasurados, adulterados, danificados ou ilegíveis.

Informe o número da Certidão de Débitos que encontra-se no cabeçalho do documento.

Não esqueça de conferir o status de seu documento bem como sua data de validade.

0026129

Buscar Documento

🔍 Sua consulta localizou 1 documento(s).

STATUS DA CERTIDÃO	CÓD. - NOME CONTRIB.	Nº CPF/CNPJ	DATA EMIÇÃO	DATA VALIDADE
CERTIDÃO NEGATIVA	100825966 - CONSTRUTORA CAMPOS	07.214.148/0001- 78	30/07/2026	28/09/2026 - Faltam 60 dias para o vencimento.



Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 07.214.148/0001-78

Razão social: CONSTRUTORA CAMPOS LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
12/07/2026	12/07/2026 a 10/08/2026	2026071211342024216200
16/06/2026	16/06/2026 a 15/07/2026	2026061606182024216202
23/05/2026	23/05/2026 a 21/06/2026	2026052304302024216230
04/05/2026	04/05/2026 a 02/06/2026	2026050408322024216227
15/04/2026	15/04/2026 a 14/05/2026	2026041507242024216208
27/03/2026	27/03/2026 a 25/04/2026	2026032705412024216281
08/03/2026	08/03/2026 a 06/04/2026	2026030817562024216210
17/02/2026	17/02/2026 a 18/03/2026	2026021703342024216265
29/01/2026	29/01/2026 a 27/02/2026	2026012905322024216227
10/01/2026	10/01/2026 a 08/02/2026	2026011003582024216294
22/12/2025	22/12/2025 a 20/01/2026	2025122205302024216203
03/12/2025	03/12/2025 a 01/01/2026	2025120318162024216270
13/11/2025	13/11/2025 a 12/12/2025	2025111304242024216285
24/10/2025	24/10/2025 a 22/11/2025	2025102407452024216251
05/10/2025	05/10/2025 a 03/11/2025	2025100515112024216204
15/09/2025	15/09/2025 a 14/10/2025	2025091507022024216253
26/08/2025	26/08/2025 a 24/09/2025	2025082608202024216251
07/08/2025	07/08/2025 a 05/09/2025	2025080720172024216225
17/07/2025	17/07/2025 a 15/08/2025	2025071719272024216227
28/06/2025	28/06/2025 a 27/07/2025	2025062802182024216297
09/06/2025	09/06/2025 a 08/07/2025	2025060903212024216229
21/05/2025	21/05/2025 a 19/06/2025	2025052102322024216205
02/05/2025	02/05/2025 a 31/05/2025	2025050219472024216250
13/04/2025	13/04/2025 a 12/05/2025	2025041302312024216243
24/03/2025	24/03/2025 a 22/04/2025	2025032423512024216210
05/03/2025	05/03/2025 a 03/04/2025	2025030508312024216257
14/02/2025	14/02/2025 a 15/03/2025	2025021421192024216293
25/01/2025	25/01/2025 a 23/02/2025	2025012508292024216250
04/01/2025	04/01/2025 a 02/02/2025	2025010402332024216235
16/12/2024	16/12/2024 a 14/01/2025	2024121602412024216230
07/11/2024	07/11/2024 a 06/12/2024	2024110702010202416255



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA CAMPOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.214.148/0001-78

Certidão nº: 16035546/2026

Expedição: 13/03/2026, às 09:14:06

Validade: 09/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA CAMPOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.214.148/0001-78**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 10/06/2026

Nº da certidão: 12602559997

Data de validade: 10/08/2026

Código de Validação: 4faadf20c4

NOME: construtora campos ltda

CNPJ: 07.214.148/0001-78

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 30/07/2026 12:05:08

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CONSTRUTORA CAMPOS LTDA**
CNPJ: **07.214.148/0001-78**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

BM - BOLETIM DE MEDIÇÕES

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA
 ENREREÇO: RUA SIMPLÍCIO MOREIRA, Nº 11,85, CENTRO - IMPERATRIZ-MA
 CONTRATADA: CONSTRUTORA CAMPOS LTDA
 CNPJ: 07.214.148-0001-78

CONTRATO: 20251201.CP.003/2025

MEDIÇÃO - 04

PERÍODO:

23/12/2025 a 23/02/2026

VALOR DA MEDIÇÃO

PERCENTUAL DE AVANÇO DO PERÍODO

R\$

308.939,34

7,21%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO TOTAL		
						QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				322.078,28		148.437,02	46,09%		38.586,94	11,98%		187.023,97	58,07%
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	549,33	3.295,97	6,00	3.295,97	100,00%		-		6,00	3.295,97	100,00%
1.2	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	501,60	106,15	53.242,68	501,60	53.242,68	100,00%		-		501,60	53.242,68	100,00%
1.3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	550,23	61,82	34.017,95	550,23	34.017,95	100,00%		-		550,23	34.017,95	100,00%
1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	MÊS	12,00	15.572,33	186.867,90	3,00	46.716,98	25,00%	2,00	31.144,65	16,67%	5,00	77.861,63	41,67%
1.5	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	12,00	1.229,75	14.757,04	3,00	3.689,26	25,00%	2,00	2.459,51	16,67%	5,00	6.148,76	41,67%
1.6	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	12,00	1.006,40	12.076,83	3,00	3.019,21	25,00%	2,00	2.012,80	16,67%	5,00	5.032,01	41,67%
1.7	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	12,00	1.484,99	17.819,90	3,00	4.454,98	25,00%	2,00	2.969,98	16,67%	5,00	7.424,96	41,67%
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				177.101,24		177.101,24	100,00%		-	0,00%		177.101,24	100,00%
2.1	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	15,90	531,63	8.452,95	15,90	8.452,95	100,00%		-		15,90	8.452,95	100,00%
2.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	117,93	52,90	6.238,28	117,93	6.238,28	100,00%		-		117,93	6.238,28	100,00%
2.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1.969,42	21,38	42.112,78	1.969,42	42.112,78	100,00%		-		1.969,42	42.112,78	100,00%
2.4	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	1.969,42	29,23	57.561,65	1.969,42	57.561,65	100,00%		-		1.969,42	57.561,65	100,00%
2.5	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	135,65	3,32	451,03	135,65	451,03	100,00%		-		135,65	451,03	100,00%
2.6	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	135,65	7,20	977,23	135,65	977,23	100,00%		-		135,65	977,23	100,00%
2.7	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	3,00	78,55	235,64	3,00	235,64	100,00%		-		3,00	235,64	100,00%
2.8	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	220,85	8,95	1.976,80	220,85	1.976,80	100,00%		-		220,85	1.976,80	100,00%
2.9	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	300,00	23,13	6.939,04	300,00	6.939,04	100,00%		-		300,00	6.939,04	100,00%
2.10	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	300,00	1,81	542,11	300,00	542,11	100,00%		-		300,00	542,11	100,00%
2.11	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	50,00	0,66	33,13	50,00	33,13	100,00%		-		50,00	33,13	100,00%
2.12	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	520,00	0,47	244,31	520,00	244,31	100,00%		-		520,00	244,31	100,00%
2.13	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E POLIÉDRICO	M2	1.200,00	9,93	11.910,58	1.200,00	11.910,58	100,00%		-		1.200,00	11.910,58	100,00%
2.14	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	35,00	11,84	414,48	35,00	414,48	100,00%		-		35,00	414,48	100,00%
2.15	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	330,77	26,32	8.707,04	330,77	8.707,04	100,00%		-		330,77	8.707,04	100,00%
2.16	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	12.900,03	2,35	30.304,18	12.900,03	30.304,18	100,00%		-		12.900,03	30.304,18	100,00%
3	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES				27.366,37		27.366,37	100,00%		-	0,00%		27.366,37	100,00%
3.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	780,12	0,54	422,91	780,12	422,91	100,00%		-		780,12	422,91	100,00%
3.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	90,34	34,43	3.110,42	90,34	3.110,42	100,00%		-		90,34	3.110,42	100,00%
3.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	25,89	48,18	1.247,27	25,89	1.247,27	100,00%		-		25,89	1.247,27	100,00%
3.4	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	331,76	5,90	1.958,38	331,76	1.958,38	100,00%		-		331,76	1.958,38	100,00%
3.5	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	45,12	23,87	1.076,79	45,12	1.076,79	100,00%		-		45,12	1.076,79	100,00%

BM - BOLETIM DE MEDIÇÕES

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA
 ENREREÇO: RUA SIMPLÍCIO MOREIRA, Nº 11,85, CENTRO - IMPERATRIZ-MA
 CONTRATADA: CONSTRUTORA CAMPOS LTDA
 CNPJ: 07.214.148-0001-78

CONTRATO: 20251201.CP.003/2025

MEDIÇÃO - 04

PERÍODO:

23/12/2025 a 23/02/2026

VALOR DA MEDIÇÃO

R\$ 308.939,34

PERCENTUAL DE AVANÇO DO PERÍODO

7,21%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO TOTAL		
						QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%
3.6	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	347,36	56,28	19.550,59	347,36	19.550,59	100,00%	-	-	-	347,36	19.550,59	100,00%
4	FUNDAÇÕES				72.957,98		72.957,98	100,00%	-	-	0,00%		72.957,98	100,00%
4.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES				39.091,00		39.091,00	100,00%	-	-	0,00%		39.091,00	100,00%
4.1.1	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	30,00	12,88	386,35	30,00	386,35	100,00%	-	-	-	30,00	386,35	100,00%
4.1.2	ESTACA RAIZ DIÂMETRO 200MM - ATÉ 40 TF	M	150,00	258,03	38.704,66	150,00	38.704,66	100,00%	-	-	-	150,00	38.704,66	100,00%
4.2	CONCRETO ARMADO PARA BLOCOS				33.866,98		33.866,98	100,00%	-	-	0,00%		33.866,98	100,00%
4.2.1	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	1,50	261,21	391,82	1,50	391,82	100,00%	-	-	-	1,50	391,82	100,00%
4.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	30,00	49,13	1.473,82	30,00	1.473,82	100,00%	-	-	-	30,00	1.473,82	100,00%
4.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	394,89	18,35	7.245,25	394,89	7.245,25	100,00%	-	-	-	394,89	7.245,25	100,00%
4.2.4	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	125,61	16,75	2.103,37	125,61	2.103,37	100,00%	-	-	-	125,61	2.103,37	100,00%
4.2.5	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	608,95	14,72	8.964,58	608,95	8.964,58	100,00%	-	-	-	608,95	8.964,58	100,00%
4.2.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	6,88	11,44	78,74	6,88	78,74	100,00%	-	-	-	6,88	78,74	100,00%
4.2.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	10,13	10,85	109,95	10,13	109,95	100,00%	-	-	-	10,13	109,95	100,00%
4.2.8	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	286,78	20,06	5.752,28	286,78	5.752,28	100,00%	-	-	-	286,78	5.752,28	100,00%
4.2.9	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	15,00	516,48	7.747,15	15,00	7.747,15	100,00%	-	-	-	15,00	7.747,15	100,00%
5	SUPERESTRUTURA				317.582,97		116.949,16	36,82%		28.724,70	9,04%		145.673,87	45,87%
5.1	CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME				69.513,84		69.513,84	100,00%	-	-	0,00%		69.513,84	100,00%
5.1.1	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	2,67	261,21	697,44	2,67	697,44	100,00%	-	-	-	2,67	697,44	100,00%
5.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	53,56	49,13	2.631,27	53,56	2.631,27	100,00%	-	-	-	53,56	2.631,27	100,00%
5.1.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	154,40	78,65	12.144,26	154,40	12.144,26	100,00%	-	-	-	154,40	12.144,26	100,00%
5.1.4	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	589,10	15,11	8.899,46	589,10	8.899,46	100,00%	-	-	-	589,10	8.899,46	100,00%
5.1.5	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	521,55	13,52	7.049,63	521,55	7.049,63	100,00%	-	-	-	521,55	7.049,63	100,00%
5.1.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1.219,83	11,44	13.960,47	1.219,83	13.960,47	100,00%	-	-	-	1.219,83	13.960,47	100,00%
5.1.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	171,64	10,85	1.863,03	171,64	1.863,03	100,00%	-	-	-	171,64	1.863,03	100,00%
5.1.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	32,95	12,08	398,14	32,95	398,14	100,00%	-	-	-	32,95	398,14	100,00%
5.1.9	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	795,26	17,07	13.575,51	795,26	13.575,51	100,00%	-	-	-	795,26	13.575,51	100,00%
5.1.10	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	16,06	516,48	8.294,62	16,06	8.294,62	100,00%	-	-	-	16,06	8.294,62	100,00%
5.2	CONCRETO ARMADO - PILARES				75.560,79		18.890,20	25,00%		15.882,56	21,02%		34.772,76	46,02%
5.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	581,21	48,25	28.042,25	145,30	7.010,56	25,00%	117,50	5.669,15	20,22%	262,80	12.679,71	45,22%
5.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.755,23	11,97	21.018,30	438,81	5.254,58	25,00%	425,00	5.089,24	24,21%	863,81	10.343,81	49,21%
5.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	41,25	10,06	414,94	10,31	103,74	25,00%	7,50	75,44	18,18%	17,81	179,18	43,18%

BM - BOLETIM DE MEDIÇÕES

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA
 ENREREÇO: RUA SIMPLÍCIO MOREIRA, Nº 11,85, CENTRO - IMPERATRIZ-MA
 CONTRATADA: CONSTRUTORA CAMPOS LTDA
 CNPJ: 07.214.148-0001-78

CONTRATO: 20251201.CP.003/2025

MEDIÇÃO - 04

PERÍODO:

23/12/2025 a 23/02/2026

VALOR DA MEDIÇÃO

PERCENTUAL DE AVANÇO DO PERÍODO

R\$

308.939,34

7,21%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO TOTAL		
						QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%
5.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	13,26	9,76	129,39	3,32	32,35	25,00%	2,25	21,96	16,97%	5,57	54,30	41,97%
5.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	803,50	14,69	11.799,59	200,88	2.949,90	25,00%	150,00	2.202,79	18,67%	350,88	5.152,68	43,67%
5.2.6	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	29,20	484,81	14.156,32	7,30	3.539,08	25,00%	5,83	2.823,99	19,95%	13,13	6.363,07	44,95%
5.3	CONCRETO ARMADO - VIGAS				71.162,58		17.790,64	25,00%		12.842,15	18,05%		30.632,79	43,05%
5.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	300,94	70,49	21.212,27	75,24	5.303,07	25,00%	56,00	3.947,26	18,61%	131,24	9.250,32	43,61%
5.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	958,05	13,36	12.799,62	239,51	3.199,90	25,00%	175,00	2.338,01	18,27%	414,51	5.537,92	43,27%
5.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	939,81	11,97	11.253,92	234,95	2.813,48	25,00%	175,00	2.095,57	18,62%	409,95	4.909,05	43,62%
5.3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	164,31	10,06	1.652,83	41,08	413,21	25,00%	31,00	311,84	18,87%	72,08	725,04	43,87%
5.3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	143,35	9,76	1.398,81	35,84	349,70	25,00%	25,27	246,59	17,63%	61,11	596,29	42,63%
5.3.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	713,59	14,69	10.479,24	178,40	2.619,81	25,00%	125,15	1.837,86	17,54%	303,55	4.457,67	42,54%
5.3.7	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	25,45	485,89	12.365,89	6,36	3.091,47	25,00%	4,25	2.065,03	16,70%	10,61	5.156,51	41,70%
5.4	CONCRETO ARMADO - LAJE				58.327,82		-	0,00%		-	0,00%		-	0,00%
5.4.1	LAJE DE PISO - MUSEU				58.327,82		-	0,00%		-	0,00%		-	0,00%
5.4.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	150,45	30,36	4.567,41	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
5.4.1.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	560,34	12,90	7.229,67	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
5.4.1.3	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	15,05	485,89	7.312,64	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
5.4.1.4	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, BIDIRECIONAL, INTEREIXO 38CM, H=30CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=25CM, INCLUSIVE TELA E FERRAGEM ADICIONAL DA TRELIÇA, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E CAPEAMENTO SCM.	M2	150,45	260,67	39.218,10	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
5.5	ESTRUTURA METÁLICA				43.017,94		10.754,49	25,00%		-	0,00%		10.754,49	25,00%
5.5.1	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPA METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	3.558,30	11,83	42.095,07	889,58	10.523,77	25,00%	-	-	0,00%	889,58	10.523,77	25,00%
5.5.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	42,63	11,22	478,13	10,66	119,53	25,00%	-	-	0,00%	10,66	119,53	25,00%
5.5.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	42,63	10,43	444,74	10,66	111,19	25,00%	-	-	0,00%	10,66	111,19	25,00%
6	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL				264.348,45		264.348,45	100,00%		-	0,00%		264.348,45	100,00%
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO				197.440,75		197.440,75	100,00%		-	0,00%		197.440,75	100,00%
6.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	1.919,82	98,21	188.539,30	1.919,82	188.539,30	100,00%	-	-	0,00%	1.919,82	188.539,30	100,00%
6.1.2	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024	M	639,94	11,36	7.269,90	639,94	7.269,90	100,00%	-	-	0,00%	639,94	7.269,90	100,00%
6.1.3	ALVENARIA BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39CM, FBK 12 MPA, ESP = 0,19M, COM ARGAMASSA AC-II, JUNTA 1CM - REV. 01	M²	15,35	106,29	1.631,56	15,35	1.631,56	100,00%	-	-	0,00%	15,35	1.631,56	100,00%
6.2	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS				12.662,57		12.662,57	100,00%		-	0,00%		12.662,57	100,00%
6.2.1	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	72,94	59,96	4.373,31	72,94	4.373,31	100,00%	-	-	0,00%	72,94	4.373,31	100,00%
6.2.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	2,90	73,27	212,48	2,90	212,48	100,00%	-	-	0,00%	2,90	212,48	100,00%
6.2.3	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	85,50	47,19	4.034,57	85,50	4.034,57	100,00%	-	-	0,00%	85,50	4.034,57	100,00%

BM - BOLETIM DE MEDIÇÕES

CONTRATO: 20251201.CP.003/2025										MEDIÇÃO - 04				PERCENTUAL DE AVANÇO DO PERÍODO	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA										VALOR DA MEDIÇÃO		R\$		7,21%	
ENREQUE: RUA SIMPLÍCIO MOREIRA, Nº 11,85, CENTRO - IMPERATRIZ-MA										23/12/2025 a 23/02/2026					
CONTRATADA: CONSTRUTORA CAMPOS LTDA										ACRÉDITO ANTERIOR		MEDIÇÃO ATUAL		ACRÉDITO TOTAL	
CNPJ: 07.214.148-0001-78										QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL
ITEM	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	PREÇO TOTAL	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL
6.2.4	M	71,30	56,69	4.042,21	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE *15* CM. AF_ 03/2024	M	71,30	56,69	4.042,21	71,30	4.042,21	71,30	4.042,21	71,30	4.042,21
6.3				54.245,12	DIVISÓRIAS				54.245,12		54.245,12		54.245,12		54.245,12
6.3.1	M2	24,29	581,25	14.118,65	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_ 01/2021	M2	24,29	581,25	14.118,65	24,29	14.118,65	24,29	14.118,65	24,29	14.118,65
6.3.2	M2	146,16	274,54	40.126,48	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUÍAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_ 07/2023_P5	M2	146,16	274,54	40.126,48	146,16	40.126,48	146,16	40.126,48	146,16	40.126,48
7				508.494,64	ESQUADRIAS				508.494,64		508.494,64		508.494,64		508.494,64
7.1				132.157,58	PORTAS DE MADEIRA				132.157,58		132.157,58		132.157,58		132.157,58
7.1.1	UN	51,00	1.321,90	67.416,91	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	UN	51,00	1.321,90	67.416,91	51,00	67.416,91	51,00	67.416,91	51,00	67.416,91
7.1.2	UN	43,00	1.193,15	51.307,19	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	UN	43,00	1.193,15	51.307,19	43,00	51.307,19	43,00	51.307,19	43,00	51.307,19
7.1.3	UN	1,00	1.118,29	1.118,29	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	UN	1,00	1.118,29	1.118,29	1,00	1.118,29	1,00	1.118,29	1,00	1.118,29
7.1.4	UN	1,00	1.426,85	1.426,85	PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE CORRER, LISA, SEMI-OCA 0,80X2,10M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	1,00	1.426,85	1.426,85	1,00	1.426,85	1,00	1.426,85	1,00	1.426,85
7.1.5	UN	3,00	3.629,45	10.888,34	PORTA CORTA FOGO, 1,50 X 2,10, DE ABRIR, 02 FOLHA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, BATENTE EM CHAPA Nº18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E=5CM, DOBRADIÇAS TIPO HELICOIDAL EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE	UN	3,00	3.629,45	10.888,34	3,00	10.888,34	3,00	10.888,34	3,00	10.888,34
7.2				24.329,31	FERRAGENS E ACESSÓRIOS				24.329,31		24.329,31		24.329,31		24.329,31
7.2.1	UN	8,00	86,63	693,04	TABUETA TIPO LIVRE/OCCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_ 12/2019	UN	8,00	86,63	693,04	8,00	693,04	8,00	693,04	8,00	693,04
7.2.2	UN	8,00	278,41	2.227,24	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	8,00	278,41	2.227,24	8,00	2.227,24	8,00	2.227,24	8,00	2.227,24
7.2.3	UN	16,00	301,56	4.824,95	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	16,00	301,56	4.824,95	16,00	4.824,95	16,00	4.824,95	16,00	4.824,95
7.2.4	M²	19,84	110,84	2.199,15	CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESURA 1 MM PARA AS PORTAS	M²	19,84	110,84	2.199,15	19,84	2.199,15	19,84	2.199,15	19,84	2.199,15
7.2.5	M2	205,25	16,29	3.343,01	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_ 01/2021	M2	205,25	16,29	3.343,01	205,25	3.343,01	205,25	3.343,01	205,25	3.343,01
7.2.6	UN	55,00	200,76	11.041,94	PLACA EM DUAS FACES, 25 X 20CM, INSERIDAS NA PAREDE, FABRICADA EM CHAPA METÁLICA E=4MM, PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA FOSCA, ABA METÁLICA EM "T" INSERIDA EM 4 PARAFUSOS COM BUCHA, PELÍCULA DA LOGOMARCA COM LETRAS "ARIAL NEGRO", LEITURA TÁTIL - BRAILE	UN	55,00	200,76	11.041,94	55,00	11.041,94	55,00	11.041,94	55,00	11.041,94
7.3				8.241,58	PORTAS EM ALUMÍNIO				8.241,58		8.241,58		8.241,58		8.241,58
7.3.1	M2	9,66	853,17	8.241,58	PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	9,66	853,17	8.241,58	9,66	8.241,58	9,66	8.241,58	9,66	8.241,58
7.4				156.437,52	JANELAS EM ALUMÍNIO E VIDRO				156.437,52		156.437,52		156.437,52		156.437,52
7.4.1	M2	288,57	542,11	156.437,52	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, INCLUSIVE PERFIS E FERRAGENS	M2	288,57	542,11	156.437,52	288,57	156.437,52	288,57	156.437,52	288,57	156.437,52
7.5				34.105,54	PORTAS DE VIDRO				34.105,54		34.105,54		34.105,54		34.105,54
7.5.1	M2	9,00	1.076,56	9.689,08	PORTA DE VIDRO - PV1 - 300 X 300 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO	M2	9,00	1.076,56	9.689,08	9,00	9.689,08	9,00	9.689,08	9,00	9.689,08
7.5.2	M2	22,68	1.076,56	24.416,47	PORTA DE VIDRO DE ABRIR 1 FOLHA TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO	M2	22,68	1.076,56	24.416,47	22,68	24.416,47	22,68	24.416,47	22,68	24.416,47
7.6				153.223,11	ESQUADRIA GERAL				153.223,11		153.223,11		153.223,11		153.223,11
7.6.1	M2	20,00	1.357,08	27.141,54	P01 - PORTÃO METÁLICO 400 X 250 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	20,00	1.357,08	27.141,54	20,00	27.141,54	20,00	27.141,54	20,00	27.141,54
7.6.2	M2	300,00	279,26	83.778,13	CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM - GALVANIZADO	M2	300,00	279,26	83.778,13	300,00	83.778,13	300,00	83.778,13	300,00	83.778,13

BM - BOLETIM DE MEDIÇÕES

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA
 ENREREÇO: RUA SIMPLÍCIO MOREIRA, Nº 11,85, CENTRO - IMPERATRIZ-MA
 CONTRATADA: CONSTRUTORA CAMPOS LTDA
 CNPJ: 07.214.148-0001-78

CONTRATO: 20251201.CP.003/2025

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA ENREFEÇO: RUA SIMPLÍCIO MOREIRA, Nº 11,85, CENTRO - IMPERATRIZ-MA CONTRATADA: CONSTRUTORA CAMPOS LTDA CNPJ: 07.214.148-0001-78						CONTRATO: 20251201.CP.003/2025						MEDIÇÃO - 04									
												PERÍODO:	23/12/2025 a 23/02/2026			VALOR DA MEDIÇÃO			PERCENTUAL DE AVANÇO DO PERÍODO		
																R\$	308.939,34		7,21%		
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO TOTAL									
						QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%							
7.6.3	GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	31,55	1.340,84	42.303,44	31,55	42.303,44	100,00%	-	-	0,00%	31,55	42.303,44	100,00%							
8	FEHÇAMENTOS ESPECIAIS				182.077,19		182.077,19	100,00%	-	-	0,00%		182.077,19	100,00%							
8.1	BRISE DE ALUMÍNIO COM PERFIS DE 10X15X250CM, ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO.	M2	276,54	260,21	71.959,63	276,54	71.959,63	100,00%	-	-	0,00%	276,54	71.959,63	100,00%							
8.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM PELE DE VIDRO, EM VIDRO LAMINADO 3+3 REFLETIVO	M2	70,68	1.557,97	110.117,56	70,68	110.117,56	100,00%	-	-	0,00%	70,68	110.117,56	100,00%							
9	SISTEMAS DE COBERTURA				297.258,19		297.258,19	100,00%	-	-	0,00%		297.258,19	100,00%							
9.1	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NÚCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM	M2	695,45	204,04	141.899,09	695,45	141.899,09	100,00%	-	-	0,00%	695,45	141.899,09	100,00%							
9.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	465,90	143,90	67.043,41	465,90	67.043,41	100,00%	-	-	0,00%	465,90	67.043,41	100,00%							
9.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	34,41	56,45	1.942,51	34,41	1.942,51	100,00%	-	-	0,00%	34,41	1.942,51	100,00%							
9.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	154,50	108,66	16.788,51	154,50	16.788,51	100,00%	-	-	0,00%	154,50	16.788,51	100,00%							
9.5	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO	M	86,02	99,44	8.553,45	86,02	8.553,45	100,00%	-	-	0,00%	86,02	8.553,45	100,00%							
9.6	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	311,35	57,70	17.966,42	311,35	17.966,42	100,00%	-	-	0,00%	311,35	17.966,42	100,00%							
9.7	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	214,70	44,07	9.461,35	214,70	9.461,35	100,00%	-	-	0,00%	214,70	9.461,35	100,00%							
9.8	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1.473,52	22,80	33.603,45	1.473,52	33.603,45	100,00%	-	-	0,00%	1.473,52	33.603,45	100,00%							
10	IMPERMEABILIZAÇÃO				12.488,02		12.488,02	100,00%	-	-	0,00%		12.488,02	100,00%							
10.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M2	250,45	49,86	12.488,02	250,45	12.488,02	100,00%	-	-	0,00%	250,45	12.488,02	100,00%							
11	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO				251.491,32		60.176,97	23,93%		36.077,86	14,35%		96.254,83	38,27%							
11.1	EDIFICAÇÃO				251.491,32		60.176,97	23,93%		36.077,86	14,35%		96.254,83	38,27%							
11.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	3.839,64	5,10	19.566,27	1.919,82	9.783,14	50,00%	959,91	4.891,57	25,00%	2.879,73	14.674,70	75,00%							
11.1.2	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	660,81	36,79	24.312,12	330,41	12.156,06	50,00%	165,20	6.078,03	25,00%	495,61	18.234,09	75,00%							
11.1.3	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	3.178,83	24,06	76.475,55	1.589,42	38.237,77	50,00%	425,00	10.224,55	13,37%	2.014,42	48.462,32	63,37%							
11.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 90 CM, PORTOBELLO, LINHA CETIM BIANCO RT OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	660,81	198,45	131.137,39	-	-	0,00%	75,00	14.883,71	11,35%	75,00	14.883,71	11,35%							
12	FORRO				68.540,86		-	0,00%		-	0,00%		-	0,00%							
12.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	695,45	98,56	68.540,86	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%							
13	SISTEMAS DE PISOS				532.882,78		47.562,11	8,93%		43.773,27	8,21%		91.335,38	17,14%							
13.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA - PREPARO DE PISO 8CM				142.100,25		47.562,11	33,47%		22.888,19	16,11%		70.450,30	49,58%							
13.1.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	1.969,42	3,10	6.097,46	1.969,42	6.097,46	100,00%		-	0,00%	1.969,42	6.097,46	100,00%							
13.1.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	196,94	210,54	41.464,65	196,94	41.464,65	100,00%		-	0,00%	196,94	41.464,65	100,00%							
13.1.3	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	1.969,42	3,22	6.334,71	-	-	0,00%	850,00	2.734,06	43,16%	850,00	2.734,06	43,16%							

BM - BOLETIM DE MEDIÇÕES

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA
ENRREÇO: RUA SIMPLÍCIO MOREIRA, Nº 11,85, CENTRO - IMPERATRIZ-MA
CONTRATADA: CONSTRUTORA CAMPOS LTDA
CNPJ: 07.214.148-0001-78

CONTRATO: 20251201.CP.003/2025

MEDIÇÃO - 04											
PERÍODO:		23/12/2025 a 23/02/2026		VALOR DA MEDIÇÃO			PERCENTUAL DE AVANÇO DO PERÍODO				
				R\$	308.939,34		7,21%				
ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO TOTAL					
QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%			
-	-	0,00%	45,00	20.154,13	22,85%	45,00	20.154,13	22,85%			
-	-	0,00%	-	20.885,08	5,51%	-	20.885,08	5,51%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	120,00	20.885,08	6,09%	120,00	20.885,08	6,09%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	18.883,60	6,50%	-	18.883,60	6,50%			
-	-	0,00%	-	18.883,60	8,33%	-	18.883,60	8,33%			
-	-	0,00%	500,00	1.825,11	11,66%	500,00	1.825,11	11,66%			
-	-	0,00%	500,00	8.487,08	11,66%	500,00	8.487,08	11,66%			
-	-	0,00%	500,00	8.571,41	11,66%	500,00	8.571,41	11,66%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
-	-	0,00%									

BM - BOLETIM DE MEDIÇÕES

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA
 ENRECREÇO: RUA SIMPLÍCIO MOREIRA, Nº 11,85, CENTRO - IMPERATRIZ-MA
 CONTRATADA: CONSTRUTORA CAMPOS LTDA
 CNPJ: 07.214.148-0001-78

CONTRATO: 20251201.CP.003/2025
MEDIÇÃO - 04
PERÍODO:

23/12/2025 a 23/02/2026

VALOR DA MEDIÇÃO
PERCENTUAL DE AVANÇO DO PERÍODO
R\$
308.939,34
7,21%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO TOTAL		
						QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%
15.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	316,70	75,26	23.833,99	-	-	0,00%	158,35	11.917,00	50,00%	158,35	11.917,00	50,00%
15.1.6	TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM	UN	24,00	38,74	929,83	-	-	0,00%	12,00	464,92	50,00%	12,00	464,92	50,00%
15.1.7	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	83,00	5,25	435,96	-	-	0,00%	42,00	220,60	50,60%	42,00	220,60	50,60%
15.1.8	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	6,22	12,43	-	-	0,00%	1,00	6,22	50,00%	1,00	6,22	50,00%
15.1.9	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	56,00	10,91	611,21	-	-	0,00%	28,00	305,61	50,00%	28,00	305,61	50,00%
15.1.10	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00	27,61	441,79	-	-	0,00%	8,00	220,89	50,00%	8,00	220,89	50,00%
15.1.11	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00	11,18	178,87	-	-	0,00%	8,00	89,44	50,00%	8,00	89,44	50,00%
15.1.12	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	38,00	11,52	437,64	-	-	0,00%	19,00	218,82	50,00%	19,00	218,82	50,00%
15.1.13	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	19,76	355,63	-	-	0,00%	9,00	177,81	50,00%	9,00	177,81	50,00%
15.1.14	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	1,00	24,33	24,33	-	-	0,00%	1,00	24,33	100,00%	1,00	24,33	100,00%
15.1.15	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	25,00	20,78	519,52	-	-	0,00%	13,00	270,15	52,00%	13,00	270,15	52,00%
15.1.16	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	216,00	8,06	1.740,83	-	-	0,00%	108,00	870,42	50,00%	108,00	870,42	50,00%
15.1.17	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	17,48	34,96	-	-	0,00%	1,00	17,48	50,00%	1,00	17,48	50,00%
15.1.18	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	18,97	94,87	-	-	0,00%	2,00	37,95	40,00%	2,00	37,95	40,00%
15.1.19	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	44,51	44,51	-	-	0,00%	1,00	44,51	100,00%	1,00	44,51	100,00%
15.1.20	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	45,00	136,70	6.151,35	-	-	0,00%	23,00	3.144,03	51,11%	23,00	3.144,03	51,11%
15.1.21	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, COM ROSCA, DN 25MM X 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	8,06	32,24	-	-	0,00%	2,00	16,12	50,00%	2,00	16,12	50,00%
15.1.22	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	8,97	17,95	-	-	0,00%	1,00	8,97	50,00%	1,00	8,97	50,00%
15.1.23	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	17,54	17,54	-	-	0,00%	1,00	17,54	100,00%	1,00	17,54	100,00%
15.1.24	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	38,00	16,90	642,27	-	-	0,00%	19,00	321,14	50,00%	19,00	321,14	50,00%
15.1.25	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	83,00	13,22	1.096,89	-	-	0,00%	42,00	555,05	50,60%	42,00	555,05	50,60%
15.1.26	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40,00	6,10	243,83	-	-	0,00%	20,00	121,92	50,00%	20,00	121,92	50,00%
15.1.27	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00	14,73	235,73	-	-	0,00%	8,00	117,87	50,00%	8,00	117,87	50,00%
15.1.28	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	53,00	23,73	1.257,82	-	-	0,00%	27,00	640,78	50,94%	27,00	640,78	50,94%
15.1.29	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	6,99	20,96	-	-	0,00%	1,00	6,99	33,33%	1,00	6,99	33,33%

BM - BOLETIM DE MEDIÇÕES

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA
ENREREÇO: RUA SIMPLÍCIO MOREIRA, Nº 11,85, CENTRO - IMPERATRIZ-MA
CONTRATADA: CONSTRUTORA CAMPOS LTDA
CNPJ: 07.214.148-0001-78

CONTRATO: 20251201.CP.003/2025
MEDIÇÃO - 04
PERÍODO:

23/12/2025 a 23/02/2026

VALOR DA MEDIÇÃO
PERCENTUAL DE AVANÇO DO PERÍODO
R\$
308.939,34
7,21%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO TOTAL		
						QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%
15.1.30	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15,00	64,61	969,12	-	-	0,00%	7,00	452,25	46,67%	7,00	452,25	46,67%
15.1.31	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	64,00	11,22	717,81	-	-	0,00%	32,00	358,90	50,00%	32,00	358,90	50,00%
15.1.32	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	25,20	25,20	-	-	0,00%	1,00	25,20	100,00%	1,00	25,20	100,00%
15.1.33	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	29,30	234,39	-	-	0,00%	4,00	117,19	50,00%	4,00	117,19	50,00%
15.1.34	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	50,80	152,41	-	-	0,00%	3,00	152,41	100,00%	3,00	152,41	100,00%
15.1.35	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18,00	114,70	2.064,58	-	-	0,00%	9,00	1.032,29	50,00%	9,00	1.032,29	50,00%
15.1.36	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	19,00	20,66	392,55	-	-	0,00%	10,00	206,61	52,63%	10,00	206,61	52,63%
15.1.37	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	33,00	134,72	4.445,80	-	-	0,00%	17,00	2.290,26	51,52%	17,00	2.290,26	51,52%
15.1.38	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	21,18	84,71	-	-	0,00%	2,00	42,36	50,00%	2,00	42,36	50,00%
15.2	TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS				19.174,53	-	-	0,00%	19.174,53	100,00%		19.174,53	100,00%	
15.2.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	286,09	2.288,73	-	-	0,00%	8,00	2.288,73	100,00%	8,00	2.288,73	100,00%
15.2.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	16,00	136,07	2.177,13	-	-	0,00%	16,00	2.177,13	100,00%	16,00	2.177,13	100,00%
15.2.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	39,00	76,93	3.000,34	-	-	0,00%	39,00	3.000,34	100,00%	39,00	3.000,34	100,00%
15.2.4	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	13,00	73,15	950,94	-	-	0,00%	13,00	950,94	100,00%	13,00	950,94	100,00%
15.2.5	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	29,23	29,23	-	-	0,00%	1,00	29,23	100,00%	1,00	29,23	100,00%
15.2.6	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	35,61	35,61	-	-	0,00%	1,00	35,61	100,00%	1,00	35,61	100,00%
15.2.7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	68,31	68,31	-	-	0,00%	1,00	68,31	100,00%	1,00	68,31	100,00%
15.2.8	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00	442,68	10.624,26	-	-	0,00%	24,00	10.624,26	100,00%	24,00	10.624,26	100,00%
15.3	RESERVATÓRIO 5.000 L - (SOMENTE INSTALAÇÃO DE CAIXA EXISTENTE)				2.376,91	-	-	0,00%	2.376,91	100,00%		2.376,91	100,00%	
15.3.1	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 5.000 LITROS	UN	1,00	2.376,91	2.376,91	-	-	0,00%	1,00	2.376,91	100,00%	1,00	2.376,91	100,00%
16	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO				77.517,07	-	-	0,00%	39.026,61	50,35%		39.026,61	50,35%	
16.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES				27.887,10	-	-	0,00%	13.783,02	49,42%		13.783,02	49,42%	
16.1.1	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	88,70	20,89	1.852,89	-	-	0,00%	44,35	926,45	50,00%	44,35	926,45	50,00%
16.1.2	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	207,20	26,90	5.573,86	-	-	0,00%	103,60	2.786,93	50,00%	103,60	2.786,93	50,00%
16.1.3	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	21,10	33,61	709,19	-	-	0,00%	10,55	354,60	50,00%	10,55	354,60	50,00%
16.1.4	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	252,10	37,43	9.436,07	-	-	0,00%	126,05	4.718,04	50,00%	126,05	4.718,04	50,00%
16.1.5	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	39,00	58,83	2.294,19	-	-	0,00%	19,50	1.147,09	50,00%	19,50	1.147,09	50,00%
16.1.6	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	24,00	8,61	206,73	-	-	0,00%	12,00	103,36	50,00%	12,00	103,36	50,00%

BM - BOLETIM DE MEDIÇÕES
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA

ENREDECO: RUA SIMPLÍCIO MOREIRA, Nº 11,85, CENTRO - IMPERATRIZ-MA

CONTRATADA: CONSTRUTORA CAMPOS LTDA

CNPJ: 07.214.148-0001-78

CONTRATO: 20251201.CP.003/2025

MEDICÃO - 04
PERÍODO:

23/12/2025 a 23/02/2026

VALOR DA MEDIÇÃO
R\$ 308.939,34
PERCENTUAL DE AVANÇO DO PERÍODO
7,21%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO TOTAL		
						QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%
16.1.7	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	74,00	10,16	751,51	-	-	0,00%	37,00	375,76	50,00%	37,00	375,76	50,00%
16.1.8	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,00	11,99	95,89	-	-	0,00%	4,00	47,95	50,00%	4,00	47,95	50,00%
16.1.9	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	24,00	29,67	712,12	-	-	0,00%	12,00	356,06	50,00%	12,00	356,06	50,00%
16.1.10	CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	UN	3,00	36,08	108,24	-	-	0,00%	1,00	36,08	33,33%	1,00	36,08	33,33%
16.1.11	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	5,00	42,24	211,18	-	-	0,00%	2,00	84,47	40,00%	2,00	84,47	40,00%
16.1.12	CURVA CURTA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	4,00	29,67	118,69	-	-	0,00%	2,00	59,34	50,00%	2,00	59,34	50,00%
16.1.13	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	UN	40,00	9,96	398,51	-	-	0,00%	20,00	199,26	50,00%	20,00	199,26	50,00%
16.1.14	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	60,00	14,59	875,33	-	-	0,00%	30,00	437,67	50,00%	30,00	437,67	50,00%
16.1.15	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	22,34	89,34	-	-	0,00%	2,00	44,67	50,00%	2,00	44,67	50,00%
16.1.16	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	26,95	188,64	-	-	0,00%	3,00	80,85	42,86%	3,00	80,85	42,86%
16.1.17	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	109,25	327,76	-	-	0,00%	1,00	109,25	33,33%	1,00	109,25	33,33%
16.1.18	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	46,00	9,72	447,21	-	-	0,00%	23,00	223,60	50,00%	23,00	223,60	50,00%
16.1.19	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	51,00	13,79	703,48	-	-	0,00%	25,00	344,84	49,02%	25,00	344,84	49,02%
16.1.20	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	15,00	26,05	390,68	-	-	0,00%	7,00	182,32	46,67%	7,00	182,32	46,67%
16.1.21	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	13,00	51,61	670,92	-	-	0,00%	6,00	309,65	46,15%	6,00	309,65	46,15%
16.1.22	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	21,00	19,03	399,72	-	-	0,00%	10,00	190,34	47,62%	10,00	190,34	47,62%
16.1.23	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	14,29	128,59	-	-	0,00%	4,00	57,15	44,44%	4,00	57,15	44,44%
16.1.24	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	6,00	94,54	567,27	-	-	0,00%	3,00	283,63	50,00%	3,00	283,63	50,00%
16.1.25	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UN	16,00	33,94	542,98	-	-	0,00%	8,00	271,49	50,00%	8,00	271,49	50,00%
16.1.26	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UN	2,00	33,94	67,87	-	-	0,00%	1,00	33,94	50,00%	1,00	33,94	50,00%
16.1.27	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	18,23	18,23	-	-	0,00%	1,00	18,23	100,00%	1,00	18,23	100,00%
16.2	VENTILAÇÃO				16.212,68	-	-	0,00%	11.149,94	68,77%		11.149,94	68,77%	
16.2.1	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	46,00	14,59	671,09	-	-	0,00%	46,00	671,09	100,00%	46,00	671,09	100,00%
16.2.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	248,00	9,06	2.246,71	-	-	0,00%	248,00	2.246,71	100,00%	248,00	2.246,71	100,00%
16.2.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	19,48	38,96	-	-	0,00%	2,00	38,96	100,00%	2,00	38,96	100,00%
16.2.4	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	39,00	19,03	742,33	-	-	0,00%	39,00	742,33	100,00%	39,00	742,33	100,00%

BM - BOLETIM DE MEDIÇÕES

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA
ENREPEREÇO: RUA SIMPLÍCIO MOREIRA, Nº 11,85, CENTRO - IMPERATRIZ-MA
CONTRATADA: CONSTRUTORA CAMPOS LTDA
CNPJ: 07.214.148-0001-78

CONTRATO: 20251201.CP.003/2025
MEDICÃO - 04
PERÍODO:

23/12/2025 a 23/02/2026

VALOR DA MEDIÇÃO
R\$
308.939,34
PERCENTUAL DE AVANÇO DO PERÍODO
7,21%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO TOTAL		
						QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%
16.2.5	LUBA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	5,81	11,61	-	-	0,00%	2,00	11,61	100,00%	2,00	11,61	100,00%
16.2.6	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	24,00	11,60	278,43	-	-	0,00%	24,00	278,43	100,00%	24,00	278,43	100,00%
16.2.7	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	388,20	26,90	10.442,91	-	-	0,00%	200,00	5.380,17	51,52%	200,00	5.380,17	51,52%
16.2.8	TÉ, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	2,00	83,79	167,57	-	-	0,00%	2,00	167,57	100,00%	2,00	167,57	100,00%
16.2.9	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	38,26	229,57	-	-	0,00%	6,00	229,57	100,00%	6,00	229,57	100,00%
16.2.10	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	56,00	16,49	923,57	-	-	0,00%	56,00	923,57	100,00%	56,00	923,57	100,00%
16.2.11	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	65,70	459,93	-	-	0,00%	7,00	459,93	100,00%	7,00	459,93	100,00%
16.3	ACESSÓRIOS				14.093,66	-	-	0,00%		14.093,66	100,00%		14.093,66	100,00%
16.3.1	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	17,00	604,49	10.276,36	-	-	0,00%	17,00	10.276,36	100,00%	17,00	10.276,36	100,00%
16.3.2	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	17,00	52,36	890,05	-	-	0,00%	17,00	890,05	100,00%	17,00	890,05	100,00%
16.3.3	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	76,29	457,76	-	-	0,00%	6,00	457,76	100,00%	6,00	457,76	100,00%
16.3.4	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	28,00	21,06	589,63	-	-	0,00%	28,00	589,63	100,00%	28,00	589,63	100,00%
16.3.5	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	7,00	268,55	1.879,85	-	-	0,00%	7,00	1.879,85	100,00%	7,00	1.879,85	100,00%
16.4	UNIDADE DE TRATAMENTO				19.323,64	-	-	0,00%		-	0,00%		-	0,00%
16.4.1	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	11.144,56	11.144,56	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
16.4.2	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	8.179,07	8.179,07	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
17	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS				40.175,82	-	-	0,00%		20.345,05	50,64%		20.345,05	50,64%
17.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC				31.989,84	-	-	0,00%		15.964,71	49,91%		15.964,71	49,91%
17.1.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	163,00	35,06	5.714,23	-	-	0,00%	81,50	2.857,12	50,00%	81,50	2.857,12	50,00%
17.1.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	65,70	72,70	4.776,61	-	-	0,00%	32,85	2.388,31	50,00%	32,85	2.388,31	50,00%
17.1.3	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	39,70	121,58	4.826,64	-	-	0,00%	19,85	2.413,32	50,00%	19,85	2.413,32	50,00%
17.1.4	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	62,80	189,98	11.930,77	-	-	0,00%	31,40	5.965,39	50,00%	31,40	5.965,39	50,00%
17.1.5	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	32,40	23,07	747,47	-	-	0,00%	16,20	373,73	50,00%	16,20	373,73	50,00%
17.1.6	TÉ, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	6,00	68,81	412,87	-	-	0,00%	3,00	206,44	50,00%	3,00	206,44	50,00%
17.1.7	CAP, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	6,00	14,43	86,59	-	-	0,00%	3,00	43,30	50,00%	3,00	43,30	50,00%
17.1.8	CURVA 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, VINILFORT, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UN	2,00	68,08	136,15	-	-	0,00%	1,00	68,08	50,00%	1,00	68,08	50,00%
17.1.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	16,00	43,65	698,34	-	-	0,00%	8,00	349,17	50,00%	8,00	349,17	50,00%

BM - BOLETIM DE MEDIÇÕES

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA
ENREREÇO: RUA SIMPLÍCIO MOREIRA, Nº 11,85, CENTRO - IMPERATRIZ-MA
CONTRATADA: CONSTRUTORA CAMPOS LTDA
CNPJ: 07.214.148-0001-78

CONTRATO: 20251201.CP.003/2025
MEDIÇÃO - 04
PERÍODO:

23/12/2025 a 23/02/2026

VALOR DA MEDIÇÃO
PERCENTUAL DE AVANÇO DO PERÍODO
R\$ 308.939,34
7,21%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO TOTAL		
						QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%
17.1.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00	15,05	30,09	-	-	0,00%	1,00	15,05	50,00%	1,00	15,05	50,00%
17.1.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	48,00	42,54	2.041,81	-	-	0,00%	24,00	1.020,91	50,00%	24,00	1.020,91	50,00%
17.1.12	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	41,61	41,61	-	-	0,00%	1,00	41,61	100,00%	1,00	41,61	100,00%
17.1.13	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	UN	3,00	102,04	306,11	-	-	0,00%	1,00	102,04	33,33%	1,00	102,04	33,33%
17.1.14	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	UN	2,00	102,04	204,08	-	-	0,00%	1,00	102,04	50,00%	1,00	102,04	50,00%
17.1.15	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00	18,23	36,45	-	-	0,00%	1,00	18,23	50,00%	1,00	18,23	50,00%
17.2	ACESSÓRIOS				8.185,98			0,00%		4.380,34	53,51%		4.380,34	53,51%
17.2.1	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	13,00	604,49	7.858,40	-	-	0,00%	7,00	4.231,44	53,85%	7,00	4.231,44	53,85%
17.2.2	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	11,00	29,78	327,58	-	-	0,00%	5,00	148,90	45,45%	5,00	148,90	45,45%
18	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS				64.216,15			0,00%			0,00%			0,00%
18.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	31,00	225,22	6.981,75	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
18.2	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	31,00	25,23	782,02	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
18.3	LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	173,09	692,36	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
18.4	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	31,00	172,31	5.341,53	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
18.5	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	851,38	851,38	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
18.6	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	159,80	159,80	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
18.7	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	35,00	100,19	3.506,81	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
18.8	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	108,28	108,28	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
18.9	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	35,00	14,85	519,89	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
18.10	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	35,00	254,46	8.905,95	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
18.11	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	154,06	154,06	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
18.12	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	94,40	94,40	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
18.13	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	66,00	42,63	2.813,86	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
18.14	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	22,00	74,74	1.644,26	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
18.15	DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL	UN	31,00	174,43	5.407,26	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
18.16	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	278,41	2.227,24	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
18.17	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	292,31	1.169,23	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
18.18	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	301,56	1.206,24	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%

BM - BOLETIM DE MEDIÇÕES

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA
ENREREÇO: RUA SIMPLÍCIO MOREIRA, Nº 11,85, CENTRO - IMPERATRIZ-MA
CONTRATADA: CONSTRUTORA CAMPOS LTDA
CNPJ: 07.214.148-0001-78

CONTRATO: 20251201.CP.003/2025
MEDIÇÃO - 04
PERÍODO:

23/12/2025 a 23/02/2026

VALOR DA MEDIÇÃO
R\$
308.939,34
PERCENTUAL DE AVANÇO DO PERÍODO
7,21%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO TOTAL		
						QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%
18.19	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	22,00	146,55	3.224,13	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
18.20	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	31,00	123,66	3.833,52	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
18.21	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	22,00	128,88	2.835,32	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
18.22	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	16,90	635,09	10.733,04	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
18.23	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	22,00	46,54	1.023,82	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				231.712,12	-	-	0,00%	31.043,83	13,40%		31.043,83	13,40%	
19.1	ACESSÓRIOS PERFILADOS PERFORADOS				33,01	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.1.1	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2	UND	1,00	20,11	20,11	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.1.2	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO	UND	1,00	12,90	12,90	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.2	ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS				3.036,77	-	-	0,00%	3.036,77	100,00%		3.036,77	100,00%	
19.2.1	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UND	4,00	4,18	16,72	-	-	0,00%	4,00	16,72	100,00%	4,00	16,72	100,00%
19.2.2	ARRUELA EM ALUMINIO	UND	4,00	1,37	5,49	-	-	0,00%	4,00	5,49	100,00%	4,00	5,49	100,00%
19.2.3	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	242,00	11,00	2.661,73	-	-	0,00%	242,00	2.661,73	100,00%	242,00	2.661,73	100,00%
19.2.4	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	15,75	31,49	-	-	0,00%	2,00	31,49	100,00%	2,00	31,49	100,00%
19.2.5	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	30,49	30,49	-	-	0,00%	1,00	30,49	100,00%	1,00	30,49	100,00%
19.2.6	CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA	UN	41,00	6,01	246,47	-	-	0,00%	41,00	246,47	100,00%	41,00	246,47	100,00%
19.2.7	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	9,06	9,06	-	-	0,00%	1,00	9,06	100,00%	1,00	9,06	100,00%
19.2.8	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 38 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	17,66	35,32	-	-	0,00%	2,00	35,32	100,00%	2,00	35,32	100,00%
19.3	ACESSÓRIOS GERAL				12.744,47	-	-	0,00%	12.744,47	100,00%		12.744,47	100,00%	
19.3.1	ARRUELA EM ALUMINIO	UND	1.847,00	1,37	2.536,58	-	-	0,00%	1.847,00	2.536,58	100,00%	1.847,00	2.536,58	100,00%
19.3.2	BUCHA DE NYLON	UND	17,00	0,72	12,29	-	-	0,00%	17,00	12,29	100,00%	17,00	12,29	100,00%
19.3.3	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UND	1.155,00	0,73	848,77	-	-	0,00%	1.155,00	848,77	100,00%	1.155,00	848,77	100,00%
19.3.4	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UND	1.739,00	0,88	1.529,32	-	-	0,00%	1.739,00	1.529,32	100,00%	1.739,00	1.529,32	100,00%
19.3.5	SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023	M	201,00	24,82	4.988,16	-	-	0,00%	201,00	4.988,16	100,00%	201,00	4.988,16	100,00%
19.3.6	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	KG	256,00	8,87	2.269,84	-	-	0,00%	256,00	2.269,84	100,00%	256,00	2.269,84	100,00%
19.3.7	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	1,00	15,58	15,58	-	-	0,00%	1,00	15,58	100,00%	1,00	15,58	100,00%
19.3.8	ARMAÇAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR	KG	1,00	73,80	73,80	-	-	0,00%	1,00	73,80	100,00%	1,00	73,80	100,00%
19.3.9	BLOCO DE ENGATE RÁPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	2,00	48,43	96,86	-	-	0,00%	2,00	96,86	100,00%	2,00	96,86	100,00%
19.3.10	CABO DE COBRE NU 6 MM2 MEIO-DURO	M	2,20	10,65	23,43	-	-	0,00%	2,20	23,43	100,00%	2,20	23,43	100,00%
19.3.11	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM	UN	1,00	42,21	42,21	-	-	0,00%	1,00	42,21	100,00%	1,00	42,21	100,00%
19.3.12	CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA	UN	1,00	23,18	23,18	-	-	0,00%	1,00	23,18	100,00%	1,00	23,18	100,00%
19.3.13	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM	UN	5,00	18,21	91,07	-	-	0,00%	5,00	91,07	100,00%	5,00	91,07	100,00%
19.3.14	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	145,92	145,92	-	-	0,00%	1,00	145,92	100,00%	1,00	145,92	100,00%
19.3.15	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	1,00	13,24	13,24	-	-	0,00%	1,00	13,24	100,00%	1,00	13,24	100,00%
19.3.16	PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM	UN	16,00	0,70	11,18	-	-	0,00%	16,00	11,18	100,00%	16,00	11,18	100,00%
19.3.17	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM	UN	1,00	23,03	23,03	-	-	0,00%	1,00	23,03	100,00%	1,00	23,03	100,00%
19.4	CABOS				85.537,86	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%

BM - BOLETIM DE MEDIÇÕES

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA
ENREDECO: RUA SIMPLÍCIO MOREIRA, Nº 11,85, CENTRO - IMPERATRIZ-MA
CONTRATADA: CONSTRUTORA CAMPOS LTDA
CNPJ: 07.214.148-0001-78

CONTRATO: 20251201.CP.003/2025
MEDIÇÃO - 04
PERÍODO:

23/12/2025 a 23/02/2026

VALOR DA MEDIÇÃO
R\$
308.939,34
PERCENTUAL DE AVANÇO DO PERÍODO
7,21%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO TOTAL		
						QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%
19.4.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	201,70	116,05	23.406,94	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.4.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	46,80	69,31	3.243,53	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.4.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	9,40	12,32	115,85	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.4.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	37,50	28,83	1.081,06	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.4.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4.343,10	2,53	10.987,44	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.4.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	463,10	13,28	6.148,00	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.4.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	127,90	19,25	2.462,21	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.4.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4.933,80	3,60	17.771,74	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.4.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	511,70	25,85	13.228,86	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.4.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	103,90	5,46	567,01	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.4.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	862,50	7,57	6.525,23	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.5	CAIXAS DE PASSAGEM				2.926,82	-	-	0,00%	2.926,82	100,00%		2.926,82	100,00%	
19.5.1	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	3,00	21,60	64,80	-	-	0,00%	3,00	64,80	100,00%	3,00	64,80	100,00%
19.5.2	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM	UN	2,00	35,88	71,75	-	-	0,00%	2,00	71,75	100,00%	2,00	71,75	100,00%
19.5.3	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	14,00	199,30	2.790,27	-	-	0,00%	14,00	2.790,27	100,00%	14,00	2.790,27	100,00%
19.6	DISPOSITIVOS ELÉTRICOS				9.696,51	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.6.1	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	38,10	190,52	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.6.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	31,35	282,12	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.6.3	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	47,87	191,50	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.6.4	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	64,38	64,38	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.6.5	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	30,00	14,26	427,91	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.6.6	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	30,00	11,59	347,68	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.6.7	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	27,00	53,32	1.439,63	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.6.8	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	14,00	60,13	841,77	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.6.9	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	54,57	54,57	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.6.10	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	69,84	488,85	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.6.11	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	135,00	36,85	4.974,97	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%

BM - BOLETIM DE MEDIÇÕES

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA						MEDIÇÃO - 04								
ENREREÇO: RUA SIMPLÍCIO MOREIRA, Nº 11,85, CENTRO - IMPERATRIZ-MA						CONTRATO: 20251201.CP.003/2025			VALOR DA MEDIÇÃO			PERCENTUAL DE AVANÇO DO PERÍODO		
CONTRATADA: CONSTRUTORA CAMPOS LTDA						PERÍODO: 23/12/2025 a 23/02/2026			R\$ 308.939,34			7,21%		
CNPJ: 07.214.148-0001-78						ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO TOTAL		
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%
19.6.12	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	39,26	392,61	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.7	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO				5.275,14	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.7.1	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	45,66	182,63	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.7.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	56,00	8,35	467,52	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.7.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	13,00	8,35	108,53	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.7.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	13,00	10,25	133,28	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.7.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6,00	11,85	71,13	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.7.6	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	282,57	282,57	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.7.7	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	45,66	91,32	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.7.8	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	410,57	410,57	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.7.9	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	51,38	102,76	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.7.10	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	56,04	112,08	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.7.11	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6,00	112,31	673,88	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.7.12	DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 8 KA	UN	36,00	48,79	1.756,45	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.7.13	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30MA	UN	3,00	110,06	330,18	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.7.14	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30MA	UN	1,00	110,13	110,13	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.7.15	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 30MA	UN	2,00	118,23	236,46	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.7.16	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 80A - 30MA	UN	1,00	205,65	205,65	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.8	ELETROCALHAS				36.134,20	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.8.1	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 75MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	121,00	180,38	21.825,86	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.8.2	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	105,30	109,75	11.556,44	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.8.3	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO	UND	92,00	12,90	1.187,01	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.8.4	TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	105,66	316,99	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.8.5	TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	92,99	278,97	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.8.6	TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00	108,74	652,41	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.8.7	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	UND	1,00	82,27	82,27	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.8.8	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD	UN	4,00	24,93	99,70	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.8.9	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD	UN	8,00	16,82	134,54	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.9	ELETRODUTOS				28.351,05	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.9.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	46,80	20,70	968,60	-	-	0,00%	46,80	968,60	100,00%	46,80	968,60	100,00%
19.9.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.611,40	9,94	25.954,02	-	-	0,00%	1.000,00	9.938,74	38,29%	1.000,00	9.938,74	38,29%

BM - BOLETIM DE MEDIÇÕES

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA
ENRECREÇO: RUA SIMPLÍCIO MOREIRA, Nº 11,85, CENTRO - IMPERATRIZ-MA
CONTRATADA: CONSTRUTORA CAMPOS LTDA
CNPJ: 07.214.148-0001-78

CONTRATO: 20251201.CP.003/2025
MEDIÇÃO - 04
PERÍODO:

23/12/2025 a 23/02/2026

VALOR DA MEDIÇÃO
R\$ 308.939,34
PERCENTUAL DE AVANÇO DO PERÍODO
7,21%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO TOTAL		
						QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%
19.9.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	17,20	6,73	115,83	-	-	0,00%	17,20	115,83	100,00%	17,20	115,83	100,00%
19.9.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	59,30	14,38	852,97	-	-	0,00%	59,30	852,97	100,00%	59,30	852,97	100,00%
19.9.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (5"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	17,10	19,68	336,61	-	-	0,00%	17,10	336,61	100,00%	17,10	336,61	100,00%
19.9.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,00	11,47	22,94	-	-	0,00%	2,00	22,94	100,00%	2,00	22,94	100,00%
19.9.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,00	16,83	33,66	-	-	0,00%	2,00	33,66	100,00%	2,00	33,66	100,00%
19.9.8	ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO LEVE, DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	2,20	30,19	66,42	-	-	0,00%	2,20	66,42	100,00%	2,20	66,42	100,00%
19.10	PERFILADOS				5.185,61	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.10.1	GANCHO PARA PERFILADO 44X32 MM	M	53,00	28,24	1.496,62	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.10.2	SUORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023	M	44,90	21,52	966,06	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.10.3	PERFILADO PERFURADO 38X38 MM	M	44,90	60,64	2.722,93	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.11	ILUMINAÇÃO				34.114,69	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.11.1	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 18 W	UN	14,00	54,24	759,30	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.11.2	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 31 W	UN	89,00	135,12	12.025,56	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.11.3	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 39 W	UN	125,00	135,12	16.889,83	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.11.4	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	UN	6,00	31,88	191,26	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.11.5	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA LED DE 200 W	UN	5,00	149,86	749,32	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.11.6	LUMINÁRIA TIPO SPOT BALIZADOR LED 12W	UN	9,00	153,49	1.381,41	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.11.7	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	17,00	124,59	2.118,02	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.12	QUADROS				8.676,00	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.12.1	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	89,41	89,41	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.12.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00	1.073,32	8.586,59	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
20	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO				81.379,30	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
20.1	ACESSÓRIOS CABEAMENTO				15.222,70	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
20.1.1	SWITCH TIPO 48 PORTAS	UN	1,00	5.963,13	5.963,13	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
20.1.2	PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES.	UN	48,00	63,01	3.024,27	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
20.1.3	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	3,00	1.374,92	4.124,76	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
20.1.4	RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 10 TOMADAS, PADRÃO RACK 19"	UN	1,00	170,61	170,61	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
20.1.5	GUIA DE CABOS FECHADO 1U	UN	2,00	36,48	72,96	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
20.1.6	BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"	UN	1,00	138,26	138,26	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
20.1.7	RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	1,00	1.687,79	1.687,79	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
20.1.8	GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS	UN	1,00	40,92	40,92	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
20.2	ACESSÓRIOS				5.560,90	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
20.2.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	42,00	11,00	461,95	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
20.2.2	ARRUELA EM ALUMÍNIO	UND	697,00	1,37	957,23	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
20.2.3	BUCHA DE NYLON	UND	23,00	0,72	16,62	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
20.2.4	PARAFUSO EM AÇO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA	UND	481,00	3,16	1.518,18	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
20.2.5	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	UND	593,00	0,88	521,50	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
20.2.6	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	39,24	7,81	306,32	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%

BM - BOLETIM DE MEDIÇÕES

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA					CONTRATO: 20251201.CP.003/2025			MEDIÇÃO - 04								
ENREERO: RUA SIMPLÍCIO MOREIRA, Nº 11,85, CENTRO - IMPERATRIZ-MA								PERÍODO:	23/12/2025 a 23/02/2026		VALOR DA MEDIÇÃO			PERCENTUAL DE AVANÇO DO PERÍODO		
CONTRATADA: CONSTRUTORA CAMPOS LTDA								R\$	308.939,34			7,21%				
CNPJ: 07.214.148-0001-78																
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO TOTAL				
						QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%		
20.2.7	SUPOORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	65,00	27,37	1.779,09	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%		
20.3	CAIXAS E QUADROS				3.801,97	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%		
20.3.1	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	UN	5,00	340,41	1.702,05	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%		
20.3.2	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	4,00	256,65	1.026,59	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%		
20.3.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	1.073,32	1.073,32	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%		
20.4	DISPOSITIVOS				2.069,43	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%		
20.4.1	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	28,00	59,92	1.677,80	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%		
20.4.2	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	27,97	391,62	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%		
20.5	ELETROCALHA E ELETRODUTOS				18.892,44	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%		
20.5.1	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	77,60	139,12	10.795,57	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%		
20.5.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4,20	20,70	86,93	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%		
20.5.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	258,40	17,05	4.404,80	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%		
20.5.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	51,80	16,03	830,59	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%		
20.5.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	46,90	35,78	1.678,06	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%		
20.5.6	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"	UND	1,00	193,69	193,69	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%		
20.5.7	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	UND	3,00	82,27	246,81	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%		
20.5.8	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO	UND	12,00	12,90	154,83	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%		
20.5.9	TERMINAL A COMPRESSÃO	UN	5,00	17,95	89,75	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%		
20.5.10	TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	102,86	411,43	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%		
20.6	CABEAMENTO				35.831,86	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%		
20.6.1	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	6.209,50	5,77	35.831,86	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%		
21	INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)				38.252,45	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%		
21.1	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	15,00	37,84	567,59	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%		
21.2	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	15,00	97,88	1.468,22	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%		
21.3	TERMINAL AÉREO EM BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 300 MM	M	60,00	27,43	1.645,85	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%		
21.4	BARRA CHATA EM ALUMINIO 7/8" X 1/8"	UN	300,00	36,15	10.845,87	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%		
21.5	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	550,00	42,18	23.197,01	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%		
21.6	BARRA RE-BAR REDONDA AÇO GALVANIZADO 80MM2	UN	20,00	26,39	527,90	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%		
22	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO				71.645,95	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%		
22.1	EXTINTORES				2.137,42	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%		
22.1.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	8,00	233,22	1.865,74	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%		
22.1.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	1,00	271,68	271,68	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%		
22.2	HIDRANTES				8.248,15	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%		

BM - BOLETIM DE MEDIÇÕES

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA
 ENREREÇO: RUA SIMPLÍCIO MOREIRA, Nº 11,85, CENTRO - IMPERATRIZ-MA
 CONTRATADA: CONSTRUTORA CAMPOS LTDA
 CNPJ: 07.214.148-0001-78

CONTRATO: 20251201.CP.003/2025
MEDIÇÃO - 04

PERÍODO:	23/12/2025 a 23/02/2026	VALOR DA MEDIÇÃO	PERCENTUAL DE AVANÇO DO PERÍODO
		R\$ 308.939,34	7,21%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO TOTAL		
						QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%
22.2.1	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	2.183,79	4.367,57	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.2.2	HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	3.880,58	3.880,58	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.3	ACESSÓRIOS				28.893,88	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.3.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	136,07	272,14	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.3.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	235,61	235,61	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.3.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	286,09	1.144,36	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.3.4	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	397,08	397,08	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.3.5	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	792,08	1.584,15	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.3.6	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	1.091,21	2.182,43	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.3.7	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	366,00	732,00	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.3.8	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	199,67	199,67	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.3.9	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	50,03	100,06	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.3.10	MOTO BOMBA 5.00 CV - VAZÃO 12.0 M³/H - PRESSÃO 15 MCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	4.376,75	8.753,51	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.3.11	PRESSOSTATO	UN	3,00	627,45	1.882,36	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.3.12	TANQUE DE PRESSÃO PWB-24LX	UN	1,00	669,11	669,11	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.3.13	VÁLVULA DE ALÍVIO COM MOLA 2"	UN	1,00	4.021,77	4.021,77	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.3.14	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2,00	2.637,43	5.274,85	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.3.15	BOMBA JOCKEY IP-21 BT4 60HZ, PRESSÃO 15 MCA - VAZÃO 1,23 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.444,78	1.444,78	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.4	TUBULAÇÕES E CONEXÕES				24.939,02	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.4.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	0,54	51,48	27,80	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.4.2	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	0,22	63,67	14,01	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.4.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	1,51	73,39	110,82	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.4.4	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	0,33	102,86	33,94	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.4.5	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	97,54	126,65	12.353,40	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.4.6	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	8,06	167,99	1.354,04	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.4.7	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	30,67	30,67	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%

BM - BOLETIM DE MEDIÇÕES

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA
ENRECREÇO: RUA SIMPLÍCIO MOREIRA, Nº 11,85, CENTRO - IMPERATRIZ-MA
CONTRATADA: CONSTRUTORA CAMPOS LTDA
CNPJ: 07.214.148-0001-78

CONTRATO: 20251201.CP.003/2025
MEDIÇÃO - 04
PERÍODO:

23/12/2025 a 23/02/2026

VALOR DA MEDIÇÃO
R\$
308.939,34
PERCENTUAL DE AVANÇO DO PERÍODO
7,21%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO TOTAL		
						QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%
22.4.8	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00	55,91	279,55	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.4.9	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	22,00	83,06	1.827,40	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.4.10	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	11,00	111,17	1.222,86	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.4.11	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"	UN	5,00	16,36	81,80	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.4.12	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	39,79	198,96	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.4.13	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	66,03	66,03	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.4.14	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 X 25 MM (1 1/2" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	89,61	179,21	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.4.15	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	269,72	269,72	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.4.16	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 75 X 65 MM, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	349,98	349,98	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.4.17	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	292,63	877,90	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.4.18	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	323,44	646,87	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.4.19	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	354,25	708,51	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.4.20	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	72,63	217,89	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.4.21	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1"	UN	1,00	84,71	84,71	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.4.22	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1"	UN	2,00	193,90	387,79	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.4.23	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2"	UN	1,00	193,90	193,90	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.4.24	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2"	UN	2,00	198,86	397,72	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.4.25	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	226,93	453,86	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.4.26	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	289,34	1.157,37	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.4.27	ADAPTADOR PARA MANÔMETRO	UN	1,00	98,39	98,39	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.4.28	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	43,65	17,75	774,58	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.4.29	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	5,00	32,51	162,57	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.4.30	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	17,32	86,62	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.4.31	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	UN	5,00	21,30	106,50	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.4.32	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	8,78	43,91	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.4.33	ADAPTADOR PARA CONDULETE 25MM	UN	9,00	15,53	139,76	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.5	SINALIZAÇÕES				7.427,48			0,00%			0,00%			0,00%
22.5.1	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	36,00	21,05	757,66	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.5.2	SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA.	UN	101,00	55,56	5.611,62	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.5.3	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	M2	12,00	88,18	1.058,20	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%

BM - BOLETIM DE MEDIÇÕES

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA
 ENRECREÇO: RUA SIMPLÍCIO MOREIRA, Nº 11,85, CENTRO - IMPERATRIZ-MA
 CONTRATADA: CONSTRUTORA CAMPOS LTDA
 CNPJ: 07.214.148-0001-78

CONTRATO: 20251201.CP.003/2025
MEDIÇÃO - 04
PERÍODO:

23/12/2025 a 23/02/2026

VALOR DA MEDIÇÃO
R\$
308.939,34
PERCENTUAL DE AVANÇO DO PERÍODO
7,21%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO TOTAL		
						QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%
23	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO				36.015,22		-	0,00%		-	0,00%		-	0,00%
23.1	DUTOS				31.655,73		-	0,00%		-	0,00%		-	0,00%
23.1.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	450,87	3,98	1.792,43	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
23.1.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	620,34	5,79	3.594,61	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
23.1.3	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	16,90	38,35	648,04	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
23.1.4	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	154,90	68,97	10.683,27	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
23.1.5	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	138,00	108,24	14.937,38	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
23.2	DRENO				4.359,50		-	0,00%		-	0,00%		-	0,00%
23.2.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	128,80	27,80	3.581,20	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
23.2.2	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	24,00	17,54	420,97	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
23.2.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	19,00	17,48	332,12	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
23.2.4	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	25,20	25,20	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
24	INSTALAÇÕES DE EXAUSTÃO MECÂNICA				8.158,72		-	0,00%		-	0,00%		-	0,00%
24.1	INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR	UN	4,00	552,20	2.208,78	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
24.2	DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR	M	7,70	72,70	559,82	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
24.3	COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM	UN	1,00	5.390,12	5.390,12	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
25	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				128.860,36		-	0,00%		-	0,00%		-	0,00%
25.1	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	UN	1,00	20.515,77	20.515,77	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
25.2	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	64,53	909,48	58.689,05	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
25.3	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	135,60	226,52	30.715,96	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
25.4	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	301,00	36,55	11.001,69	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
25.5	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M	M2	5,44	620,24	3.374,09	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
25.6	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,50M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. AF_03/2024	M	3,15	1.448,83	4.563,80	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
26	SERVIÇOS FINAIS				96.466,49		-	0,00%		-	0,00%		-	0,00%
26.1	LIMPEZA GROSSA DE OBRA	M2	4.500,00	13,89	62.505,62	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
26.2	LIMPEZA FINA DE OBRA	M2	4.500,00	7,18	32.309,93	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
26.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX - 500 X 700 MM	UN	1,00	1.650,95	1.650,95	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
TOTAL DO CONTRATO					4.282.427,00		1.915.217,34	44,72%		308.939,34		2.224.156,68	51,94%	

BM - BOLETIM DE MEDIÇÕES


OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA
 ENDEREÇO: RUA SIMPLÍCIO MOREIRA, Nº 11,85, CENTRO - IMPERATRIZ-MA
 CONTRATADA: CONSTRUTORA CAMPOS LTDA
 CNPJ: 07.214.148-0001-78

CONTRATO: 20251201.CP.003/2025
MEDIÇÃO - 04

PERÍODO:	23/12/2025 a 23/02/2026	VALOR DA MEDIÇÃO	PERCENTUAL DE AVANÇO DO PERÍODO
		R\$ 308.939,34	7,21%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO TOTAL		
						QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%


 CONSTRUTORA CAMPOS LTDA
 CIDSON C. DI FRANCO M. DA SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL - RESPONSÁVEL TÉCNICO
 CREA Nº: 150204770-5 RNP


 CONSTRUTORA CAMPOS LTDA
 JOSÉ WILSON FERREIRA CAMPOS
 REPRESENTANTE LEGAL
 CPF: 345.170.653-91

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE: CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

LOCAL: RUA SIMPLÍCIO MOREIRA, Nº 1185

BAIRRO: CENTRO, IMPERATRIZ - MA


CONTRATO Nº: 20251201.CP.003/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA


CONSTRUTORA: CONSTRUTORA CAMPOS LTDA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 23/12/2025 à 23/02/2026

DATA: 22/07/2026

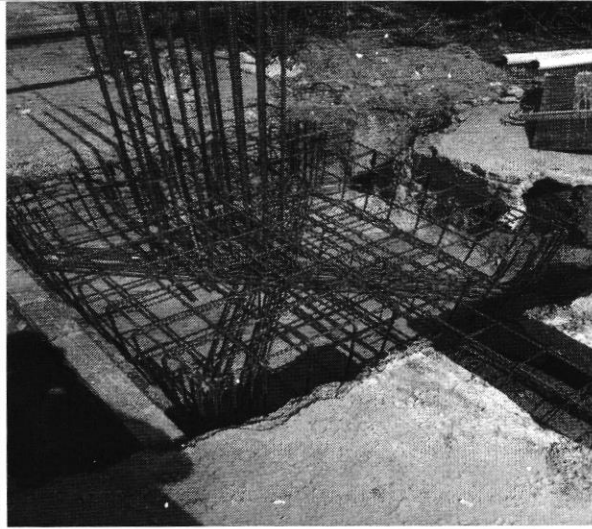


EXECUÇÃO BLOCOS DE FUNDAÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO

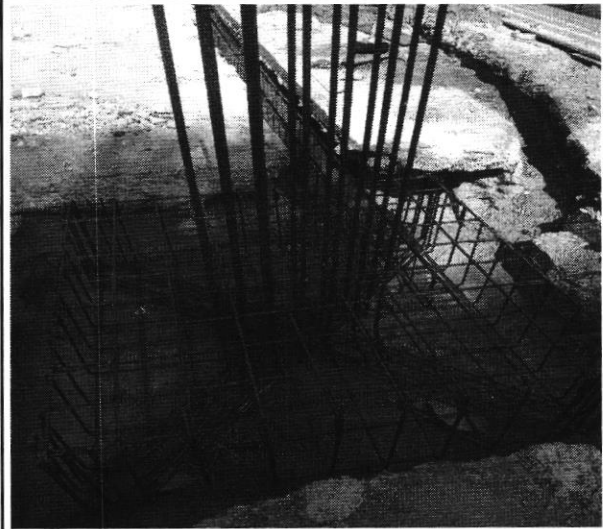

EXECUÇÃO BLOCOS DE FUNDAÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO




EXECUÇÃO DE PAREDES E ESTRUTURA DE CONCRETO

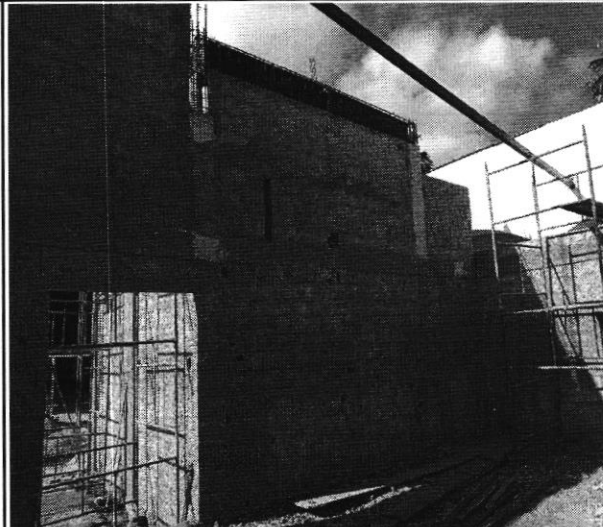

EXECUÇÃO DE PAREDES E ESTRUTURA DE CONCRETO



EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDES - REBOCO

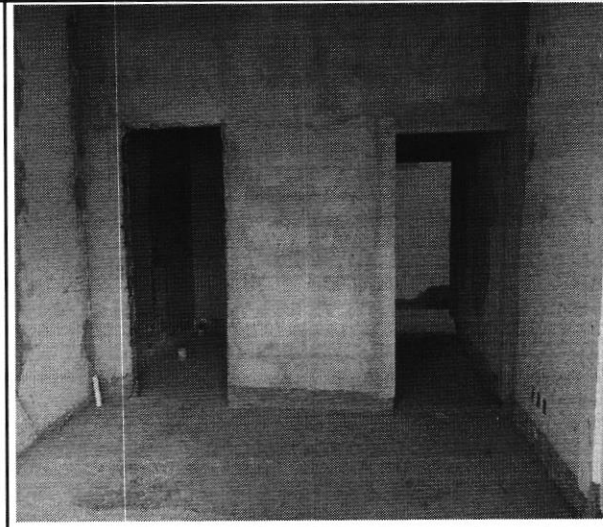

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDES - REBOCO

CONSTRUTORA CAMPOS LTDA
CIDSON C. DI FRANCO M. DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº: 150204770-5 RNP

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE: CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

LOCAL: RUA SIMPLÍCIO MOREIRA, Nº 1185

BAIRRO: CENTRO, IMPERATRIZ - MA

CONTRATO Nº: 20251201.CP.003/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA


CONSTRUTORA: CONSTRUTORA CAMPOS LTDA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 23/12/2025 à 23/02/2026

DATA: 22/07/2026



EXECUÇÃO DE REVESTIMENTOS INTERNOS DE PAREDE

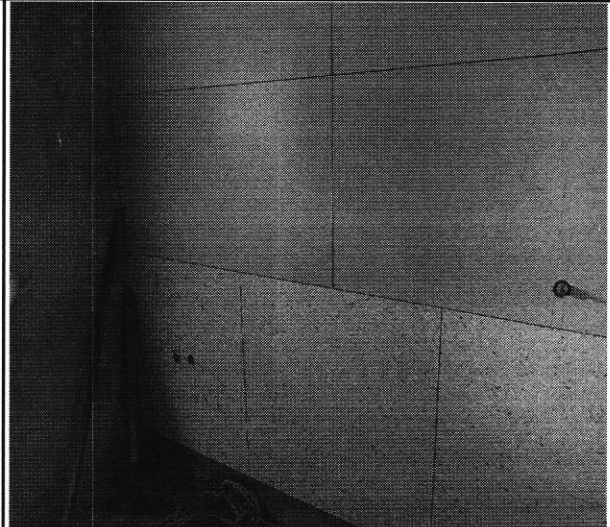


EXECUÇÃO DE REVESTIMENTOS INTERNOS DE PAREDE




EXECUÇÃO DE PINTURA EM PAREDES



EXECUÇÃO DE PINTURA EM PAREDES

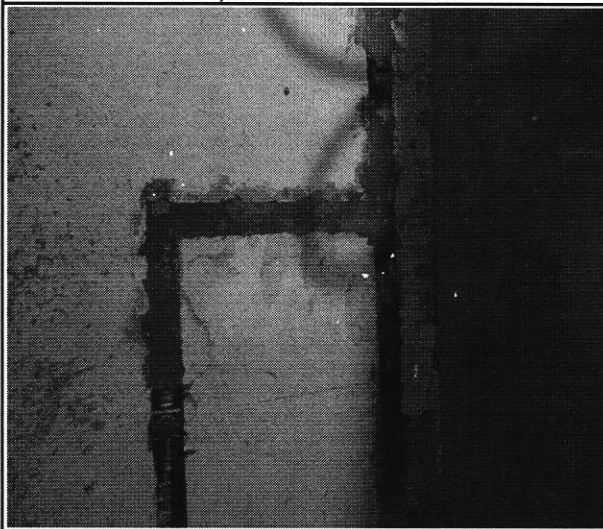

INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

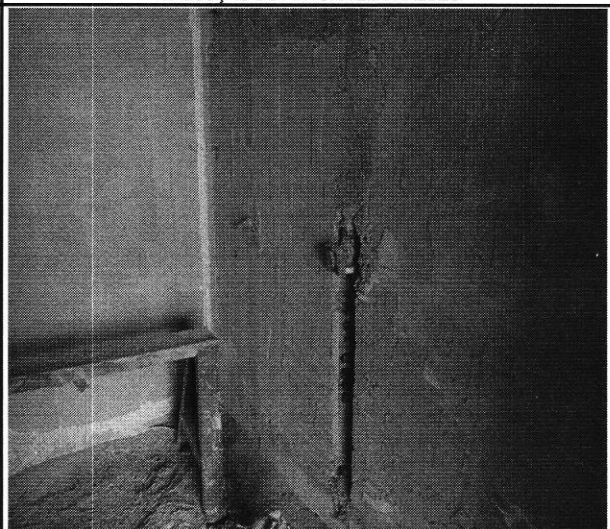

INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

CONSTRUTORA CAMPOS LTDA
CIDSON C. DI FRANCO M. DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº: 150204770-5 RNP

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE: CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

LOCAL: RUA SIMPLÍCIO MOREIRA, Nº 1185

BAIRRO: CENTRO, IMPERATRIZ - MA

CONTRATO Nº: 20251201.CP.003/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA

CONSTRUTORA: CONSTRUTORA CAMPOS LTDA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 23/12/2025 à 23/02/2026

DATA: 22/07/2026



INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS



INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS



INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS ELÉTRICOS



INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS ELÉTRICOS



EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO



EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO

CONSTRUTORA CAMPOS LTDA
CIDSON C. DI FRANCO M. DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº: 150204770-5 RNP



BM - BOLETIM DE MEDIÇÕES

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA
ENREFEÇO: RUA SIMPLÍCIO MOREIRA, Nº 11,85, CENTRO - IMPERATRIZ-MA
CONTRATADA: CONSTRUTORA CAMPOS LTDA
CNPJ: 07.214.148-0001-78

CONTRATO: 20251201.CP.003/2025

MEDIÇÃO - 04

PERÍODO:

23/12/2025 a 23/02/2026

VALOR DA MEDIÇÃO

R\$

308.939,34

PERCENTUAL DE AVANÇO DO PERÍODO

7,21%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO TOTAL		
						QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				322.078,28		148.437,02	46,09%		38.586,94	11,98%		187.023,97	58,07%
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	549,33	3.295,97	6,00	3.295,97	100,00%		-		6,00	3.295,97	100,00%
1.2	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	501,60	106,15	53.242,68	501,60	53.242,68	100,00%		-		501,60	53.242,68	100,00%
1.3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	550,23	61,82	34.017,95	550,23	34.017,95	100,00%		-		550,23	34.017,95	100,00%
1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	MÊS	12,00	15.572,33	186.867,90	3,00	46.716,98	25,00%	2,00	31.144,65	16,67%	5,00	77.861,63	41,67%
1.5	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	12,00	1.229,75	14.757,04	3,00	3.689,26	25,00%	2,00	2.459,51	16,67%	5,00	6.148,76	41,67%
1.6	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	12,00	1.006,40	12.076,83	3,00	3.019,21	25,00%	2,00	2.012,80	16,67%	5,00	5.032,01	41,67%
1.7	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	12,00	1.484,99	17.819,90	3,00	4.454,98	25,00%	2,00	2.969,98	16,67%	5,00	7.424,96	41,67%
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				177.101,24		177.101,24	100,00%		-	0,00%		177.101,24	100,00%
2.1	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	15,90	531,63	8.452,95	15,90	8.452,95	100,00%		-		15,90	8.452,95	100,00%
2.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	117,93	52,90	6.238,28	117,93	6.238,28	100,00%		-		117,93	6.238,28	100,00%
2.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1.969,42	21,38	42.112,78	1.969,42	42.112,78	100,00%		-		1.969,42	42.112,78	100,00%
2.4	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	1.969,42	29,23	57.561,65	1.969,42	57.561,65	100,00%		-		1.969,42	57.561,65	100,00%
2.5	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	135,65	3,32	451,03	135,65	451,03	100,00%		-		135,65	451,03	100,00%
2.6	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	135,65	7,20	977,23	135,65	977,23	100,00%		-		135,65	977,23	100,00%
2.7	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	3,00	78,55	235,64	3,00	235,64	100,00%		-		3,00	235,64	100,00%
2.8	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	220,85	8,95	1.976,80	220,85	1.976,80	100,00%		-		220,85	1.976,80	100,00%
2.9	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	300,00	23,13	6.939,04	300,00	6.939,04	100,00%		-		300,00	6.939,04	100,00%
2.10	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	300,00	1,81	542,11	300,00	542,11	100,00%		-		300,00	542,11	100,00%
2.11	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	50,00	0,66	33,13	50,00	33,13	100,00%		-		50,00	33,13	100,00%
2.12	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	520,00	0,47	244,31	520,00	244,31	100,00%		-		520,00	244,31	100,00%
2.13	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E POLIÉDRICO	M2	1.200,00	9,93	11.910,58	1.200,00	11.910,58	100,00%		-		1.200,00	11.910,58	100,00%
2.14	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	35,00	11,84	414,48	35,00	414,48	100,00%		-		35,00	414,48	100,00%
2.15	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	330,77	26,32	8.707,04	330,77	8.707,04	100,00%		-		330,77	8.707,04	100,00%
2.16	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	12.900,03	2,35	30.304,18	12.900,03	30.304,18	100,00%		-		12.900,03	30.304,18	100,00%
3	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES				27.366,37		27.366,37	100,00%		-	0,00%		27.366,37	100,00%
3.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	780,12	0,54	422,91	780,12	422,91	100,00%		-		780,12	422,91	100,00%
3.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	90,34	34,43	3.110,42	90,34	3.110,42	100,00%		-		90,34	3.110,42	100,00%
3.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	25,89	48,18	1.247,27	25,89	1.247,27	100,00%		-		25,89	1.247,27	100,00%
3.4	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	331,76	5,90	1.958,38	331,76	1.958,38	100,00%		-		331,76	1.958,38	100,00%
3.5	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	45,12	23,87	1.076,79	45,12	1.076,79	100,00%		-		45,12	1.076,79	100,00%
3.6	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO. AF_08/2023	M3	347,36	56,28	19.550,59	347,36	19.550,59	100,00%		-		347,36	19.550,59	100,00%



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ



BM - BOLETIM DE MEDIÇÕES

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA
ENREREÇO: RUA SIMPLÍCIO MOREIRA, Nº 11,85, CENTRO - IMPERATRIZ-MA
CONTRATADA: CONSTRUTORA CAMPOS LTDA
CNPJ: 07.214.148-0001-78

CONTRATO: 20251201.CP.003/2025

MEDIÇÃO - 04

PERÍODO:

23/12/2025 a 23/02/2026

VALOR DA MEDIÇÃO

R\$ 308.939,34

PERCENTUAL DE AVANÇO DO PERÍODO

7,21%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO TOTAL		
						QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%
4	FUNDAÇÕES				72.957,98		72.957,98	100,00%		-	0,00%		72.957,98	100,00%
4.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES				39.091,00		39.091,00	100,00%		-	0,00%		39.091,00	100,00%
4.1.1	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	30,00	12,88	386,35	30,00	386,35	100,00%		-		30,00	386,35	100,00%
4.1.2	ESTACA RAIZ DIÂMETRO 200MM - ATÉ 40 TF	M	150,00	258,03	38.704,66	150,00	38.704,66	100,00%		-		150,00	38.704,66	100,00%
4.2	CONCRETO ARMADO PARA BLOCOS				33.866,98		33.866,98	100,00%		-	0,00%		33.866,98	100,00%
4.2.1	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	1,50	261,21	391,82	1,50	391,82	100,00%		-		1,50	391,82	100,00%
4.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	30,00	49,13	1.473,82	30,00	1.473,82	100,00%		-		30,00	1.473,82	100,00%
4.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	394,89	18,35	7.245,25	394,89	7.245,25	100,00%		-		394,89	7.245,25	100,00%
4.2.4	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	125,61	16,75	2.103,37	125,61	2.103,37	100,00%		-		125,61	2.103,37	100,00%
4.2.5	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	608,95	14,72	8.964,58	608,95	8.964,58	100,00%		-		608,95	8.964,58	100,00%
4.2.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	6,88	11,44	78,74	6,88	78,74	100,00%		-		6,88	78,74	100,00%
4.2.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	10,13	10,85	109,95	10,13	109,95	100,00%		-		10,13	109,95	100,00%
4.2.8	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	286,78	20,06	5.752,28	286,78	5.752,28	100,00%		-		286,78	5.752,28	100,00%
4.2.9	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	15,00	516,48	7.747,15	15,00	7.747,15	100,00%		-		15,00	7.747,15	100,00%
5	SUPERESTRUTURA				317.582,97		116.949,16	36,82%		28.724,70	9,04%		145.673,87	45,87%
5.1	CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME				69.513,84		69.513,84	100,00%		-	0,00%		69.513,84	100,00%
5.1.1	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	2,67	261,21	697,44	2,67	697,44	100,00%		-		2,67	697,44	100,00%
5.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	53,56	49,13	2.631,27	53,56	2.631,27	100,00%		-		53,56	2.631,27	100,00%
5.1.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	154,40	78,65	12.144,26	154,40	12.144,26	100,00%		-		154,40	12.144,26	100,00%
5.1.4	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	589,10	15,11	8.899,46	589,10	8.899,46	100,00%		-		589,10	8.899,46	100,00%
5.1.5	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	521,55	13,52	7.049,63	521,55	7.049,63	100,00%		-		521,55	7.049,63	100,00%
5.1.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1.219,83	11,44	13.960,47	1.219,83	13.960,47	100,00%		-		1.219,83	13.960,47	100,00%
5.1.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	171,64	10,85	1.863,03	171,64	1.863,03	100,00%		-		171,64	1.863,03	100,00%
5.1.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	32,95	12,08	398,14	32,95	398,14	100,00%		-		32,95	398,14	100,00%
5.1.9	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	795,26	17,07	13.575,51	795,26	13.575,51	100,00%		-		795,26	13.575,51	100,00%
5.1.10	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	16,06	516,48	8.294,62	16,06	8.294,62	100,00%		-		16,06	8.294,62	100,00%
5.2	CONCRETO ARMADO - PILARES				75.560,79		18.890,20	25,00%		15.882,56	21,02%		34.772,76	46,02%
5.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	581,21	48,25	28.042,25	145,30	7.010,56	25,00%	117,50	5.669,15	20,22%	262,80	12.679,71	45,22%
5.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.755,23	11,97	21.018,30	438,81	5.254,58	25,00%	425,00	5.089,24	24,21%	863,81	10.343,81	49,21%
5.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	41,25	10,06	414,94	10,31	103,74	25,00%	7,50	75,44	18,18%	17,81	179,18	43,18%
5.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	13,26	9,76	129,39	3,32	32,35	25,00%	2,25	21,96	16,97%	5,57	54,30	41,97%



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ



BM - BOLETIM DE MEDIÇÕES

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA
ENRECREÇO: RUA SIMPLÍCIO MOREIRA, Nº 11,85, CENTRO - IMPERATRIZ-MA
CONTRATADA: CONSTRUTORA CAMPOS LTDA
CNPJ: 07.214.148-0001-78

CONTRATO: 20251201.CP.003/2025

MEDIÇÃO - 04

PERÍODO:

23/12/2025 a 23/02/2026

VALOR DA MEDIÇÃO

R\$ 308.939,34

PERCENTUAL DE AVANÇO DO PERÍODO

7,21%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO TOTAL		
						QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%
5.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	803,50	14,69	11.799,59	200,88	2.949,90	25,00%	150,00	2.202,79	18,67%	350,88	5.152,68	43,67%
5.2.6	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	29,20	484,81	14.156,32	7,30	3.539,08	25,00%	5,83	2.823,99	19,95%	13,13	6.363,07	44,95%
5.3	CONCRETO ARMADO - VIGAS				71.162,58		17.790,64	25,00%	-	12.842,15	18,05%		30.632,79	43,05%
5.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	300,94	70,49	21.212,27	75,24	5.303,07	25,00%	56,00	3.947,26	18,61%	131,24	9.250,32	43,61%
5.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	958,05	13,36	12.799,62	239,51	3.199,90	25,00%	175,00	2.338,01	18,27%	414,51	5.537,92	43,27%
5.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	939,81	11,97	11.253,92	234,95	2.813,48	25,00%	175,00	2.095,57	18,62%	409,95	4.909,05	43,62%
5.3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	164,31	10,06	1.652,83	41,08	413,21	25,00%	31,00	311,84	18,87%	72,08	725,04	43,87%
5.3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	143,35	9,76	1.398,81	35,84	349,70	25,00%	25,27	246,59	17,63%	61,11	596,29	42,63%
5.3.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	713,59	14,69	10.479,24	178,40	2.619,81	25,00%	125,15	1.837,86	17,54%	303,55	4.457,67	42,54%
5.3.7	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	25,45	485,89	12.365,89	6,36	3.091,47	25,00%	4,25	2.065,03	16,70%	10,61	5.156,51	41,70%
5.4	CONCRETO ARMADO - LAJE				58.327,82		-	0,00%		-	0,00%		-	0,00%
5.4.1	LAJE DE PISO - MUSEU				58.327,82		-	0,00%		-	0,00%		-	0,00%
5.4.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	150,45	30,36	4.567,41	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
5.4.1.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	560,34	12,90	7.229,67	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
5.4.1.3	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	15,05	485,89	7.312,64	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
5.4.1.4	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELÇADA PARA PISO OU COBERTURA, BIDIRECIONAL, INTEREIXO 38CM, H=30CM, EL ENCHIMENTO EM EPS H=25CM, INCLUSIVE TELA E FERRAGEM ADICIONAL DA TRELÇA, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E CAPEAMENTO 5CM.	M2	150,45	260,67	39.218,10	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
5.5	ESTRUTURA METÁLICA				43.017,94		10.754,49	25,00%		-	0,00%		10.754,49	25,00%
5.5.1	ESTRUTURA TRELÇADA DE COBERTURA, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPA METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	3.558,30	11,83	42.095,07	889,58	10.523,77	25,00%	-	-	0,00%	889,58	10.523,77	25,00%
5.5.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	42,63	11,22	478,13	10,66	119,53	25,00%	-	-	0,00%	10,66	119,53	25,00%
5.5.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	42,63	10,43	444,74	10,66	111,19	25,00%	-	-	0,00%	10,66	111,19	25,00%
6	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL				264.348,45		264.348,45	100,00%		-	0,00%		264.348,45	100,00%
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO				197.440,75		197.440,75	100,00%		-	0,00%		197.440,75	100,00%
6.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	1.919,82	98,21	188.539,30	1.919,82	188.539,30	100,00%	-	-	0,00%	1.919,82	188.539,30	100,00%
6.1.2	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024	M	639,94	11,36	7.269,90	639,94	7.269,90	100,00%	-	-	0,00%	639,94	7.269,90	100,00%
6.1.3	ALVENARIA BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39CM, FBK 12 MPA, ESP = 0,19M, COM ARGAMASSA AC-II, JUNTA 1CM - REV. 01	M²	15,35	106,29	1.631,56	15,35	1.631,56	100,00%	-	-	0,00%	15,35	1.631,56	100,00%
6.2	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS				12.662,57		12.662,57	100,00%		-	0,00%		12.662,57	100,00%
6.2.1	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	72,94	59,96	4.373,31	72,94	4.373,31	100,00%	-	-	0,00%	72,94	4.373,31	100,00%
6.2.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	2,90	73,27	212,48	2,90	212,48	100,00%	-	-	0,00%	2,90	212,48	100,00%
6.2.3	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	85,50	47,19	4.034,57	85,50	4.034,57	100,00%	-	-	0,00%	85,50	4.034,57	100,00%
6.2.4	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	71,30	56,69	4.042,21	71,30	4.042,21	100,00%	-	-	0,00%	71,30	4.042,21	100,00%
6.3	DIVISÓRIAS				54.245,12		54.245,12	100,00%		-	0,00%		54.245,12	100,00%



BM - BOLETIM DE MEDIÇÕES

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA
ENREREÇO: RUA SIMPLÍCIO MOREIRA, Nº 11,85, CENTRO - IMPERATRIZ-MA
CONTRATADA: CONSTRUTORA CAMPOS LTDA
CNPJ: 07.214.148-0001-78

CONTRATO: 20251201.CP.003/2025

MEDIÇÃO - 04

PERÍODO:

23/12/2025 a 23/02/2026

VALOR DA MEDIÇÃO

R\$ 308.939,34

PERCENTUAL DE AVANÇO DO PERÍODO

7,21%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO TOTAL		
						QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%
6.3.1	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	24,29	581,25	14.118,65	24,29	14.118,65	100,00%		-	0,00%	24,29	14.118,65	100,00%
6.3.2	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	146,16	274,54	40.126,48	146,16	40.126,48	100,00%		-	0,00%	146,16	40.126,48	100,00%
7	ESQUADRIAS				508.494,64		508.494,64	100,00%		-	0,00%		508.494,64	100,00%
7.1	PORTAS DE MADEIRA				132.157,58		132.157,58	100,00%		-	0,00%		132.157,58	100,00%
7.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	51,00	1.321,90	67.416,91	51,00	67.416,91	100,00%		-	0,00%	51,00	67.416,91	100,00%
7.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	43,00	1.193,19	51.307,19	43,00	51.307,19	100,00%		-	0,00%	43,00	51.307,19	100,00%
7.1.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1.118,29	1.118,29	1,00	1.118,29	100,00%		-	0,00%	1,00	1.118,29	100,00%
7.1.4	PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE CORRER, LISA, SEMI-ÔCA 0,80X2,10M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	1,00	1.426,85	1.426,85	1,00	1.426,85	100,00%		-	0,00%	1,00	1.426,85	100,00%
7.1.5	PORTA CORTA FOGO, 1,50 X 2,10, DE ABRIR, 02 FOLHA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, BATENTE EM CHAPA Nº18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E=5CM, DOBRADIÇAS TIPO HELICOIDAL EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE	UN	3,00	3.629,45	10.888,34	3,00	10.888,34	100,00%		-	0,00%	3,00	10.888,34	100,00%
7.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS				24.329,31		24.329,31	100,00%		-	0,00%		24.329,31	100,00%
7.2.1	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	8,00	86,63	693,04	8,00	693,04	100,00%		-	0,00%	8,00	693,04	100,00%
7.2.2	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	278,41	2.227,24	8,00	2.227,24	100,00%		-	0,00%	8,00	2.227,24	100,00%
7.2.3	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16,00	301,56	4.824,95	16,00	4.824,95	100,00%		-	0,00%	16,00	4.824,95	100,00%
7.2.4	CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS	M²	19,84	110,84	2.199,15	19,84	2.199,15	100,00%		-	0,00%	19,84	2.199,15	100,00%
7.2.5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	205,25	16,29	3.343,01	205,25	3.343,01	100,00%		-	0,00%	205,25	3.343,01	100,00%
7.2.6	PLACA EM DUAS FACES, 25 X 20CM, INSERIDAS NA PAREDE, FABRICADA EM CHAPA METÁLICA E=4MM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA FOSCA, ABA METÁLICA EM "T" INSERIDA EM 4 PARAFUSOS COM BUCHA, PELÍCULA DA LOGOMARCA COM LETRAS "ARIAL NEGRILO", LEITURA TÁTIL - BRAILE	UN	55,00	200,76	11.041,94	55,00	11.041,94	100,00%		-	0,00%	55,00	11.041,94	100,00%
7.3	PORTAS EM ALUMÍNIO				8.241,58		8.241,58	100,00%		-	0,00%		8.241,58	100,00%
7.3.1	PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	9,66	853,17	8.241,58	9,66	8.241,58	100,00%		-	0,00%	9,66	8.241,58	100,00%
7.4	JANELAS EM ALUMÍNIO E VIDRO				156.437,52		156.437,52	100,00%		-	0,00%		156.437,52	100,00%
7.4.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, INCLUSIVE PERFS E FERRAGENS	M2	288,57	542,11	156.437,52	288,57	156.437,52	100,00%		-	0,00%	288,57	156.437,52	100,00%
7.5	PORTAS DE VIDRO				34.105,54		34.105,54	100,00%		-	0,00%		34.105,54	100,00%
7.5.1	PORTA DE VIDRO - PV1 - 300 X 300 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO	M2	9,00	1.076,56	9.689,08	9,00	9.689,08	100,00%		-	0,00%	9,00	9.689,08	100,00%
7.5.2	PORTA DE VIDRO DE ABRIR 1 FOLHA TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO	M2	22,68	1.076,56	24.416,47	22,68	24.416,47	100,00%		-	0,00%	22,68	24.416,47	100,00%
7.6	ESQUADRIA GERAL				153.223,11		153.223,11	100,00%		-	0,00%		153.223,11	100,00%
7.6.1	P01 - PORTÃO METÁLICO 400 X 250 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	20,00	1.357,08	27.141,54	20,00	27.141,54	100,00%		-	0,00%	20,00	27.141,54	100,00%
7.6.2	CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM - GALVANIZADO	M2	300,00	279,26	83.778,13	300,00	83.778,13	100,00%		-	0,00%	300,00	83.778,13	100,00%
7.6.3	GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	31,55	1.340,84	42.303,44	31,55	42.303,44	100,00%		-	0,00%	31,55	42.303,44	100,00%
8	FEHCAMENTOS ESPECIAIS				182.077,19		182.077,19	100,00%		-	0,00%		182.077,19	100,00%



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ



BM - BOLETIM DE MEDIÇÕES

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA
ENREREÇO: RUA SIMPLICIO MOREIRA, Nº 11,85, CENTRO - IMPERATRIZ-MA
CONTRATADA: CONSTRUTORA CAMPOS LTDA
CNPJ: 07.214.148-0001-78

CONTRATO: 20251201.CP.003/2025

MEDIÇÃO - 04

PERÍODO:

23/12/2025 a 23/02/2026

VALOR DA MEDIÇÃO

R\$ 308.939,34

PERCENTUAL DE AVANÇO DO PERÍODO

7,21%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO TOTAL		
						QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%
8.1	BRISE DE ALUMÍNIO COM PERFIS DE 10X15X250CM, ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO.	M2	276,54	260,21	71.959,63	276,54	71.959,63	100,00%	-	0,00%		276,54	71.959,63	100,00%
8.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM PELE DE VIDRO, EM VIDRO LAMINADO 3+3 REFLETIVO	M2	70,68	1.557,97	110.117,56	70,68	110.117,56	100,00%	-	0,00%		70,68	110.117,56	100,00%
9	SISTEMAS DE COBERTURA				297.258,19		297.258,19	100,00%	-	0,00%			297.258,19	100,00%
9.1	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NÚCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM	M2	695,45	204,04	141.899,09	695,45	141.899,09	100,00%	-	0,00%		695,45	141.899,09	100,00%
9.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	465,90	143,90	67.043,41	465,90	67.043,41	100,00%	-	0,00%		465,90	67.043,41	100,00%
9.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	34,41	56,45	1.942,51	34,41	1.942,51	100,00%	-	0,00%		34,41	1.942,51	100,00%
9.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	154,50	108,66	16.788,51	154,50	16.788,51	100,00%	-	0,00%		154,50	16.788,51	100,00%
9.5	CUMEIEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO	M	86,02	99,44	8.553,45	86,02	8.553,45	100,00%	-	0,00%		86,02	8.553,45	100,00%
9.6	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	311,35	57,70	17.966,42	311,35	17.966,42	100,00%	-	0,00%		311,35	17.966,42	100,00%
9.7	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	214,70	44,07	9.461,35	214,70	9.461,35	100,00%	-	0,00%		214,70	9.461,35	100,00%
9.8	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1.473,52	22,80	33.603,45	1.473,52	33.603,45	100,00%	-	0,00%		1.473,52	33.603,45	100,00%
10	IMPERMEABILIZAÇÃO				12.488,02		12.488,02	100,00%	-	0,00%			12.488,02	100,00%
10.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M2	250,45	49,86	12.488,02	250,45	12.488,02	100,00%	-	0,00%		250,45	12.488,02	100,00%
11	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO				251.491,32		60.176,97	23,93%	36.077,86	14,35%		96.254,83	38,27%	
11.1	EDIFICAÇÃO				251.491,32		60.176,97	23,93%	36.077,86	14,35%		96.254,83	38,27%	
11.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	3.839,64	5,10	19.566,27	1.919,82	9.783,14	50,00%	959,91	4.891,57	25,00%	2.879,73	14.674,70	75,00%
11.1.2	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	660,81	36,79	24.312,12	330,41	12.156,06	50,00%	165,20	6.078,03	25,00%	495,61	18.234,09	75,00%
11.1.3	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	3.178,83	24,06	76.475,55	1.589,42	38.237,77	50,00%	425,00	10.224,55	13,37%	2.014,42	48.462,32	63,37%
11.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 90 CM, PORTOBELLO, LINHA CETIM BIANCO RT OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	660,81	198,45	131.137,39	-	-	0,00%	75,00	14.883,71	11,35%	75,00	14.883,71	11,35%
12	FORRO				68.540,86		-	0,00%	-	0,00%		-	-	0,00%
12.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	695,45	98,56	68.540,86	-	-	0,00%	-	0,00%		-	-	0,00%
13	SISTEMAS DE PISOS				532.882,78		47.562,11	8,93%	43.773,27	8,21%		91.335,38	17,14%	
13.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA - PREPARO DE PISO 8CM				142.100,25		47.562,11	33,47%	22.888,19	16,11%		70.450,30	49,58%	
13.1.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	1.969,42	3,10	6.097,46	1.969,42	6.097,46	100,00%	-	0,00%		1.969,42	6.097,46	100,00%
13.1.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N 2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_01/2024	M3	196,94	210,54	41.464,65	196,94	41.464,65	100,00%	-	0,00%		196,94	41.464,65	100,00%
13.1.3	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	1.969,42	3,22	6.334,71	-	-	0,00%	850,00	2.734,06	43,16%	850,00	2.734,06	43,16%
13.1.4	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	196,94	447,87	88.203,43	-	-	0,00%	45,00	20.154,13	22,85%	45,00	20.154,13	22,85%
13.2	PAVIMENTAÇÃO INTERNA - REVESTIMENTOS				378.748,58		-	0,00%	20.885,08	5,51%		20.885,08	5,51%	
13.2.1	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	780,45	15,09	11.780,76	-	-	0,00%	-	0,00%		-	-	0,00%
13.2.2	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	107,69	136,40	14.688,44	-	-	0,00%	-	0,00%		-	-	0,00%



BM - BOLETIM DE MEDIÇÕES

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA
ENREREÇO: RUA SIMPLÍCIO MOREIRA, Nº 11,85, CENTRO - IMPERATRIZ-MA
CONTRATADA: CONSTRUTORA CAMPOS LTDA
CNPJ: 07.214.148-0001-78

CONTRATO: 20251201.CP.003/2025

MEDIÇÃO - 04

PERÍODO:

23/12/2025 a 23/02/2026

VALOR DA MEDIÇÃO

R\$

308.939,34

PERCENTUAL DE AVANÇO DO PERÍODO

7,21%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO TOTAL		
						QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%
13.2.3	PISO EM CHAPA XADREZ 3/16" - 4,75M, INCLUSIVE REVESTIMENTO EMBORRACHADO PLURIGOMA, NA COR PRETA OU SIMILAR	M2	11,80	806,52	9.516,93	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
13.2.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 90 X 90 CM, PORCELANATO, ESMALTADO, POLIDO, LINHA MUNARI CIMENTO, ELIANE OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV - 03	M2	1.969,42	174,04	342.762,45	-	-	0,00%	120,00	20.885,08	6,09%	120,00	20.885,08	6,09%
13.3	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA				12.033,95	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
13.3.1	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M	21,00	187,16	3.930,39	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
13.3.2	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL, COR AZUL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M	38,76	187,16	7.254,38	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
13.3.3	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M2	3,44	203,94	701,56	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
13.3.4	FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO	M	6,88	21,46	147,61	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
14	PINTURAS E ACABAMENTOS				290.484,04	-	-	0,00%	18.883,60	6,50%		18.883,60	6,50%	
14.1	PINTURA PAREDES				226.779,17	-	-	0,00%	18.883,60	8,33%		18.883,60	8,33%	
14.1.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	4.288,91	3,65	15.655,49	-	-	0,00%	500,00	1.825,11	11,66%	500,00	1.825,11	11,66%
14.1.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	4.288,91	16,97	72.800,63	-	-	0,00%	500,00	8.487,08	11,66%	500,00	8.487,08	11,66%
14.1.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	4.288,91	17,14	73.523,99	-	-	0,00%	500,00	8.571,41	11,66%	500,00	8.571,41	11,66%
14.1.4	PINTURA PARA EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO E 01 DEMÃO DE TEXTURA RISCADA EM CORES DIVERSAS, COM USO DE DESEMPENADEIRA	M2	925,00	70,05	64.799,05	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
14.2	PINTURA DE FORROS				62.435,86	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
14.2.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	481,05	19,83	9.538,88	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
14.2.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	481,05	19,34	9.301,27	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
14.2.3	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	1.969,96	22,13	43.595,71	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
14.3	PISO - ESTACIONAMENTO				1.269,01	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
14.3.1	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AMARELO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	15,45	61,63	952,22	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
14.3.2	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	2,49	61,63	153,46	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
14.3.3	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR BRANCO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	2,65	61,63	163,33	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
15	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA				82.875,03	-	-	0,00%	52.477,48	63,32%		52.477,48	63,32%	
15.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO				61.323,58	-	-	0,00%	30.926,04	50,43%		30.926,04	50,43%	
15.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	407,40	22,79	9.285,80	-	-	0,00%	203,70	4.642,90	50,00%	203,70	4.642,90	50,00%
15.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	15,50	27,80	430,97	-	-	0,00%	7,75	215,48	50,00%	7,75	215,48	50,00%
15.1.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	51,50	31,49	1.621,77	-	-	0,00%	25,75	810,89	50,00%	25,75	810,89	50,00%
15.1.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	44,50	33,38	1.485,50	-	-	0,00%	22,25	742,75	50,00%	22,25	742,75	50,00%
15.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	316,70	75,26	23.833,99	-	-	0,00%	158,35	11.917,00	50,00%	158,35	11.917,00	50,00%
15.1.6	TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM	UN	24,00	38,74	929,83	-	-	0,00%	12,00	464,92	50,00%	12,00	464,92	50,00%
15.1.7	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	83,00	5,25	435,96	-	-	0,00%	42,00	220,60	50,60%	42,00	220,60	50,60%
15.1.8	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	6,22	12,43	-	-	0,00%	1,00	6,22	50,00%	1,00	6,22	50,00%



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ



BM - BOLETIM DE MEDIÇÕES

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA ENREREÇO: RUA SIMPLÍCIO MOREIRA, Nº 11,85, CENTRO - IMPERATRIZ-MA CONTRATADA: CONSTRUTORA CAMPOS LTDA CNPJ: 07.214.148-0001-78						CONTRATO: 20251201.CP.003/2025				MEDIÇÃO - 04						
										PERÍODO: 23/12/2025 a 23/02/2026		VALOR DA MEDIÇÃO			PERCENTUAL DE AVANÇO DO PERÍODO	
						R\$			308.939,34			7,21%				
						ITEM		DESCRIÇÃO		UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		
QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%									QUANT.	VALOR TOTAL	%
15.1.9	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		UN	56,00	10,91	611,21	-	-	0,00%	28,00	305,61	50,00%	28,00	305,61	50,00%	
15.1.10	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		UN	16,00	27,61	441,79	-	-	0,00%	8,00	220,89	50,00%	8,00	220,89	50,00%	
15.1.11	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		UN	16,00	11,18	178,87	-	-	0,00%	8,00	89,44	50,00%	8,00	89,44	50,00%	
15.1.12	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		UN	38,00	11,52	437,64	-	-	0,00%	19,00	218,82	50,00%	19,00	218,82	50,00%	
15.1.13	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	18,00	19,76	355,63	-	-	0,00%	9,00	177,81	50,00%	9,00	177,81	50,00%	
15.1.14	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4". PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022		UN	1,00	24,33	24,33	-	-	0,00%	1,00	24,33	100,00%	1,00	24,33	100,00%	
15.1.15	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		UN	25,00	20,78	519,52	-	-	0,00%	13,00	270,15	52,00%	13,00	270,15	52,00%	
15.1.16	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		UN	216,00	8,06	1.740,83	-	-	0,00%	108,00	870,42	50,00%	108,00	870,42	50,00%	
15.1.17	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		UN	2,00	17,48	34,96	-	-	0,00%	1,00	17,48	50,00%	1,00	17,48	50,00%	
15.1.18	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		UN	5,00	18,97	94,87	-	-	0,00%	2,00	37,95	40,00%	2,00	37,95	40,00%	
15.1.19	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		UN	1,00	44,51	44,51	-	-	0,00%	1,00	44,51	100,00%	1,00	44,51	100,00%	
15.1.20	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		UN	45,00	136,70	6.151,35	-	-	0,00%	23,00	3.144,03	51,11%	23,00	3.144,03	51,11%	
15.1.21	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, COM ROSCA, DN 25MM X 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		UN	4,00	8,06	32,24	-	-	0,00%	2,00	16,12	50,00%	2,00	16,12	50,00%	
15.1.22	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		UN	2,00	8,97	17,95	-	-	0,00%	1,00	8,97	50,00%	1,00	8,97	50,00%	
15.1.23	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		UN	1,00	17,54	17,54	-	-	0,00%	1,00	17,54	100,00%	1,00	17,54	100,00%	
15.1.24	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		UN	38,00	16,90	642,27	-	-	0,00%	19,00	321,14	50,00%	19,00	321,14	50,00%	
15.1.25	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		UN	83,00	13,22	1.096,89	-	-	0,00%	42,00	555,05	50,60%	42,00	555,05	50,60%	
15.1.26	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		UN	40,00	6,10	243,83	-	-	0,00%	20,00	121,92	50,00%	20,00	121,92	50,00%	
15.1.27	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		UN	16,00	14,73	235,73	-	-	0,00%	8,00	117,87	50,00%	8,00	117,87	50,00%	
15.1.28	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		UN	53,00	23,73	1.257,82	-	-	0,00%	27,00	640,78	50,94%	27,00	640,78	50,94%	
15.1.29	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		UN	3,00	6,99	20,96	-	-	0,00%	1,00	6,99	33,33%	1,00	6,99	33,33%	
15.1.30	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		UN	15,00	64,61	969,12	-	-	0,00%	7,00	452,25	46,67%	7,00	452,25	46,67%	
15.1.31	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		UN	64,00	11,22	717,81	-	-	0,00%	32,00	358,90	50,00%	32,00	358,90	50,00%	
15.1.32	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		UN	1,00	25,20	25,20	-	-	0,00%	1,00	25,20	100,00%	1,00	25,20	100,00%	
15.1.33	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		UN	8,00	29,30	234,39	-	-	0,00%	4,00	117,19	50,00%	4,00	117,19	50,00%	



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ



BM - BOLETIM DE MEDIÇÕES

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA ENREREÇO: RUA SIMPLICIO MOREIRA, Nº 11,85, CENTRO - IMPERATRIZ-MA CONTRATADA: CONSTRUTORA CAMPOS LTDA CNPJ: 07.214.148-0001-78						CONTRATO: 20251201.CP.003/2025		MEDIÇÃO - 04								
								PERÍODO:	23/12/2025 a 23/02/2026	VALOR DA MEDIÇÃO			PERCENTUAL DE AVANÇO DO PERÍODO			
						R\$	308.939,34			7,21%						
						ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL	
QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%							QUANT.	VALOR TOTAL	%		
15.1.34	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	50,80	152,41	-	-	0,00%	3,00	152,41	100,00%	3,00	152,41	100,00%		
15.1.35	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18,00	114,70	2.064,58	-	-	0,00%	9,00	1.032,29	50,00%	9,00	1.032,29	50,00%		
15.1.36	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	19,00	20,66	392,55	-	-	0,00%	10,00	206,61	52,63%	10,00	206,61	52,63%		
15.1.37	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	33,00	134,72	4.445,80	-	-	0,00%	17,00	2.290,26	51,52%	17,00	2.290,26	51,52%		
15.1.38	TÉ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	21,18	84,71	-	-	0,00%	2,00	42,36	50,00%	2,00	42,36	50,00%		
15.2	TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS				19.174,53	-	-	0,00%	19.174,53	100,00%		19.174,53	100,00%			
15.2.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	286,09	2.288,73	-	-	0,00%	8,00	2.288,73	100,00%	8,00	2.288,73	100,00%		
15.2.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	16,00	136,07	2.177,13	-	-	0,00%	16,00	2.177,13	100,00%	16,00	2.177,13	100,00%		
15.2.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	39,00	76,93	3.000,34	-	-	0,00%	39,00	3.000,34	100,00%	39,00	3.000,34	100,00%		
15.2.4	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	13,00	73,15	950,94	-	-	0,00%	13,00	950,94	100,00%	13,00	950,94	100,00%		
15.2.5	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	29,23	29,23	-	-	0,00%	1,00	29,23	100,00%	1,00	29,23	100,00%		
15.2.6	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	35,61	35,61	-	-	0,00%	1,00	35,61	100,00%	1,00	35,61	100,00%		
15.2.7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	68,31	68,31	-	-	0,00%	1,00	68,31	100,00%	1,00	68,31	100,00%		
15.2.8	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00	442,68	10.624,26	-	-	0,00%	24,00	10.624,26	100,00%	24,00	10.624,26	100,00%		
15.3	RESERVATÓRIO 5.000 L - (SOMENTE INSTALAÇÃO DE CAIXA EXISTENTE)				2.376,91	-	-	0,00%	2.376,91	100,00%		2.376,91	100,00%			
15.3.1	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 5.000 LITROS	UN	1,00	2.376,91	2.376,91	-	-	0,00%	1,00	2.376,91	100,00%	1,00	2.376,91	100,00%		
16	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO				77.517,07	-	-	0,00%	39.026,61	50,35%		39.026,61	50,35%			
16.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES				27.887,10	-	-	0,00%	13.783,02	49,42%		13.783,02	49,42%			
16.1.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	88,70	20,89	1.852,89	-	-	0,00%	44,35	926,45	50,00%	44,35	926,45	50,00%		
16.1.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	207,20	26,90	5.573,86	-	-	0,00%	103,60	2.786,93	50,00%	103,60	2.786,93	50,00%		
16.1.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	21,10	33,61	709,19	-	-	0,00%	10,55	354,60	50,00%	10,55	354,60	50,00%		
16.1.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	252,10	37,43	9.436,07	-	-	0,00%	126,05	4.718,04	50,00%	126,05	4.718,04	50,00%		
16.1.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	39,00	58,83	2.294,19	-	-	0,00%	19,50	1.147,09	50,00%	19,50	1.147,09	50,00%		
16.1.6	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	24,00	8,61	206,73	-	-	0,00%	12,00	103,36	50,00%	12,00	103,36	50,00%		
16.1.7	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	74,00	10,16	751,51	-	-	0,00%	37,00	375,76	50,00%	37,00	375,76	50,00%		
16.1.8	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,00	11,99	95,89	-	-	0,00%	4,00	47,95	50,00%	4,00	47,95	50,00%		
16.1.9	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	24,00	29,67	712,12	-	-	0,00%	12,00	356,06	50,00%	12,00	356,06	50,00%		
16.1.10	CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	UN	3,00	36,08	108,24	-	-	0,00%	1,00	36,08	33,33%	1,00	36,08	33,33%		



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ



BM - BOLETIM DE MEDIÇÕES

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA ENREREÇO: RUA SIMPLÍCIO MOREIRA, Nº 11,85, CENTRO - IMPERATRIZ-MA CONTRATADA: CONSTRUTORA CAMPOS LTDA CNPJ: 07.214.148-0001-78						CONTRATO: 20251201.CP.003/2025						MEDIÇÃO - 04									
												PERÍODO:		23/12/2025 a 23/02/2026		VALOR DA MEDIÇÃO			PERCENTUAL DE AVANÇO DO PERÍODO		
																R\$ 308.939,34			7,21%		
																ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL		
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%							
16.1.11	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	5,00	42,24	211,18	-	-	0,00%	2,00	84,47	40,00%	2,00	84,47	40,00%							
16.1.12	CURVA CURTA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	4,00	29,67	118,69	-	-	0,00%	2,00	59,34	50,00%	2,00	59,34	50,00%							
16.1.13	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00	9,96	398,51	-	-	0,00%	20,00	199,26	50,00%	20,00	199,26	50,00%							
16.1.14	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	60,00	14,59	875,33	-	-	0,00%	30,00	437,67	50,00%	30,00	437,67	50,00%							
16.1.15	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	22,34	89,34	-	-	0,00%	2,00	44,67	50,00%	2,00	44,67	50,00%							
16.1.16	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	26,95	188,64	-	-	0,00%	3,00	80,85	42,86%	3,00	80,85	42,86%							
16.1.17	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	109,25	327,76	-	-	0,00%	1,00	109,25	33,33%	1,00	109,25	33,33%							
16.1.18	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	46,00	9,72	447,21	-	-	0,00%	23,00	223,60	50,00%	23,00	223,60	50,00%							
16.1.19	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	51,00	13,79	703,48	-	-	0,00%	25,00	344,84	49,02%	25,00	344,84	49,02%							
16.1.20	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	15,00	26,05	390,68	-	-	0,00%	7,00	182,32	46,67%	7,00	182,32	46,67%							
16.1.21	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	13,00	51,61	670,92	-	-	0,00%	6,00	309,65	46,15%	6,00	309,65	46,15%							
16.1.22	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	21,00	19,03	399,72	-	-	0,00%	10,00	190,34	47,62%	10,00	190,34	47,62%							
16.1.23	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	14,29	128,59	-	-	0,00%	4,00	57,15	44,44%	4,00	57,15	44,44%							
16.1.24	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	6,00	94,54	567,27	-	-	0,00%	3,00	283,63	50,00%	3,00	283,63	50,00%							
16.1.25	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UN	16,00	33,94	542,98	-	-	0,00%	8,00	271,49	50,00%	8,00	271,49	50,00%							
16.1.26	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UN	2,00	33,94	67,87	-	-	0,00%	1,00	33,94	50,00%	1,00	33,94	50,00%							
16.1.27	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	18,23	18,23	-	-	0,00%	1,00	18,23	100,00%	1,00	18,23	100,00%							
16.2	VENTILAÇÃO				16.212,68	-	-	0,00%		11.149,94	68,77%		11.149,94	68,77%							
16.2.1	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	46,00	14,59	671,09	-	-	0,00%	46,00	671,09	100,00%	46,00	671,09	100,00%							
16.2.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	248,00	9,06	2.246,71	-	-	0,00%	248,00	2.246,71	100,00%	248,00	2.246,71	100,00%							
16.2.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	19,48	38,96	-	-	0,00%	2,00	38,96	100,00%	2,00	38,96	100,00%							
16.2.4	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	39,00	19,03	742,33	-	-	0,00%	39,00	742,33	100,00%	39,00	742,33	100,00%							
16.2.5	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	5,81	11,61	-	-	0,00%	2,00	11,61	100,00%	2,00	11,61	100,00%							
16.2.6	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	24,00	11,60	278,43	-	-	0,00%	24,00	278,43	100,00%	24,00	278,43	100,00%							
16.2.7	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	388,20	26,90	10.442,91	-	-	0,00%	200,00	5.380,17	51,52%	200,00	5.380,17	51,52%							
16.2.8	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	2,00	83,79	167,57	-	-	0,00%	2,00	167,57	100,00%	2,00	167,57	100,00%							



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ



BM - BOLETIM DE MEDIÇÕES

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA ENREREÇO: RUA SIMPLÍCIO MOREIRA, Nº 11.85, CENTRO - IMPERATRIZ-MA CONTRATADA: CONSTRUTORA CAMPOS LTDA CNPJ: 07.214.148-0001-78						CONTRATO: 20251201.CP.003/2025		MEDIÇÃO - 04							
								PERÍODO:	23/12/2025 a 23/02/2026	VALOR DA MEDIÇÃO			PERCENTUAL DE AVANÇO DO PERÍODO		
										R\$	308.939,34	7,21%			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO TOTAL			
						QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%	
16.2.9	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	38,26	229,57	-	-	0,00%	6,00	229,57	100,00%	6,00	229,57	100,00%	
16.2.10	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	56,00	16,49	923,57	-	-	0,00%	56,00	923,57	100,00%	56,00	923,57	100,00%	
16.2.11	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	65,70	459,93	-	-	0,00%	7,00	459,93	100,00%	7,00	459,93	100,00%	
16.3	ACESSÓRIOS				14.093,66	-	-	0,00%	14.093,66	100,00%		14.093,66	100,00%		
16.3.1	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	17,00	604,49	10.276,36	-	-	0,00%	17,00	10.276,36	100,00%	17,00	10.276,36	100,00%	
16.3.2	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	17,00	52,36	890,05	-	-	0,00%	17,00	890,05	100,00%	17,00	890,05	100,00%	
16.3.3	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	76,29	457,76	-	-	0,00%	6,00	457,76	100,00%	6,00	457,76	100,00%	
16.3.4	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	28,00	21,06	589,63	-	-	0,00%	28,00	589,63	100,00%	28,00	589,63	100,00%	
16.3.5	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	7,00	268,55	1.879,85	-	-	0,00%	7,00	1.879,85	100,00%	7,00	1.879,85	100,00%	
16.4	UNIDADE DE TRATAMENTO				19.323,64	-	-	0,00%	-	0,00%		-	0,00%		
16.4.1	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020	UN	1,00	11.144,56	11.144,56	-	-	0,00%	-	0,00%		-	0,00%		
16.4.2	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020	UN	1,00	8.179,07	8.179,07	-	-	0,00%	-	0,00%		-	0,00%		
17	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS				40.175,82	-	-	0,00%	20.345,05	50,64%		20.345,05	50,64%		
17.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC				31.989,84	-	-	0,00%	15.964,71	49,91%		15.964,71	49,91%		
17.1.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	163,00	35,06	5.714,23	-	-	0,00%	81,50	2.857,12	50,00%	81,50	2.857,12	50,00%	
17.1.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	65,70	72,70	4.776,61	-	-	0,00%	32,85	2.388,31	50,00%	32,85	2.388,31	50,00%	
17.1.3	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	39,70	121,58	4.826,64	-	-	0,00%	19,85	2.413,32	50,00%	19,85	2.413,32	50,00%	
17.1.4	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	62,80	189,98	11.930,77	-	-	0,00%	31,40	5.965,39	50,00%	31,40	5.965,39	50,00%	
17.1.5	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	32,40	23,07	747,47	-	-	0,00%	16,20	373,73	50,00%	16,20	373,73	50,00%	
17.1.6	TÉ, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	6,00	68,81	412,87	-	-	0,00%	3,00	206,44	50,00%	3,00	206,44	50,00%	
17.1.7	CAP, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	6,00	14,43	86,59	-	-	0,00%	3,00	43,30	50,00%	3,00	43,30	50,00%	
17.1.8	CURVA 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, VINILFORT, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UN	2,00	68,08	136,15	-	-	0,00%	1,00	68,08	50,00%	1,00	68,08	50,00%	
17.1.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	16,00	43,65	698,34	-	-	0,00%	8,00	349,17	50,00%	8,00	349,17	50,00%	
17.1.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00	15,05	30,09	-	-	0,00%	1,00	15,05	50,00%	1,00	15,05	50,00%	
17.1.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	48,00	42,54	2.041,81	-	-	0,00%	24,00	1.020,91	50,00%	24,00	1.020,91	50,00%	
17.1.12	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	41,61	41,61	-	-	0,00%	1,00	41,61	100,00%	1,00	41,61	100,00%	
17.1.13	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	UN	3,00	102,04	306,11	-	-	0,00%	1,00	102,04	33,33%	1,00	102,04	33,33%	



BM - BOLETIM DE MEDIÇÕES

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA

ENREREÇO: RUA SIMPLÍCIO MOREIRA, Nº 11,85, CENTRO - IMPERATRIZ-MA

CONTRATADA: CONSTRUTORA CAMPOS LTDA

CNPJ: 07.214.148-0001-78

CONTRATO: 20251201.CP.003/2025

MEDIÇÃO - 04

PERÍODO:

23/12/2025 a 23/02/2026

VALOR DA MEDIÇÃO

R\$ 308.939,34

PERCENTUAL DE AVANÇO DO PERÍODO

7,21%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO TOTAL		
						QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%
17.1.14	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	UN	2,00	102,04	204,08	-	-	0,00%	1,00	102,04	50,00%	1,00	102,04	50,00%
17.1.15	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00	18,23	36,45	-	-	0,00%	1,00	18,23	50,00%	1,00	18,23	50,00%
17.2	ACESSÓRIOS				8.185,98		-	0,00%		4.380,34	53,51%		4.380,34	53,51%
17.2.1	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	13,00	604,49	7.858,40	-	-	0,00%	7,00	4.231,44	53,85%	7,00	4.231,44	53,85%
17.2.2	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	11,00	29,78	327,58	-	-	0,00%	5,00	148,90	45,45%	5,00	148,90	45,45%
18	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS				64.216,15		-	0,00%		-	0,00%		-	0,00%
18.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	31,00	225,22	6.981,75	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
18.2	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	31,00	25,23	782,02	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
18.3	LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	173,09	692,36	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
18.4	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	31,00	172,31	5.341,53	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
18.5	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	851,38	851,38	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
18.6	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	159,80	159,80	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
18.7	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	35,00	100,19	3.506,81	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
18.8	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	108,28	108,28	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
18.9	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	35,00	14,85	519,89	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
18.10	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	35,00	254,46	8.905,95	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
18.11	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	154,06	154,06	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
18.12	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	94,40	94,40	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
18.13	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	66,00	42,63	2.813,86	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
18.14	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	22,00	74,74	1.644,26	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
18.15	DUCHA / CHUVEIRO METÁLICO, DE PAREDE, ARTICULÁVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL	UN	31,00	174,43	5.407,26	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
18.16	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	278,41	2.227,24	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
18.17	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	292,31	1.169,23	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
18.18	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	301,56	1.206,24	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
18.19	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	22,00	146,55	3.224,13	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
18.20	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	31,00	123,66	3.833,52	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
18.21	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	22,00	128,88	2.835,32	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
18.22	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	16,90	635,09	10.733,04	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
18.23	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	22,00	46,54	1.023,82	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				231.712,12		-	0,00%		31.043,83	13,40%		31.043,83	13,40%
19.1	ACESSÓRIOS PERFILADOS PERFURADOS				33,01		-	0,00%		-	0,00%		-	0,00%
19.1.1	TERMINAL METÁLICO A PRESSÃO PARA 1 CABO DE 35 MM2	UND	1,00	20,11	20,11	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%



BM - BOLETIM DE MEDIÇÕES

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA ENREREÇO: RUA SIMPLICIO MOREIRA, Nº 11,85, CENTRO - IMPERATRIZ-MA CONTRATADA: CONSTRUTORA CAMPOS LTDA CNPJ: 07.214.148-0001-78						MEDIÇÃO - 04															
						CONTRATO: 20251201.CP.003/2025						PERÍODO:		23/12/2025 a 23/02/2026		VALOR DA MEDIÇÃO			PERCENTUAL DE AVANÇO DO PERÍODO		
																R\$ 308.939,34			7,21%		
						ITEM						ACUMULADO ANTERIOR						MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO TOTAL
DESCRIÇÃO						UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%			
19.1.2	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO					UND	1,00	12,90	12,90	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
19.2	ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS								3.036,77	-	-	0,00%		3.036,77	100,00%		3.036,77	100,00%			
19.2.1	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO					UND	4,00	4,18	16,72	-	-	0,00%	4,00	16,72	100,00%	4,00	16,72	100,00%			
19.2.2	ARRUELA EM ALUMINIO					UND	4,00	1,37	5,49	-	-	0,00%	4,00	5,49	100,00%	4,00	5,49	100,00%			
19.2.3	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023					UN	242,00	11,00	2.661,73	-	-	0,00%	242,00	2.661,73	100,00%	242,00	2.661,73	100,00%			
19.2.4	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023					UN	2,00	15,75	31,49	-	-	0,00%	2,00	31,49	100,00%	2,00	31,49	100,00%			
19.2.5	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023					UN	1,00	30,49	30,49	-	-	0,00%	1,00	30,49	100,00%	1,00	30,49	100,00%			
19.2.6	CAIXA DE LUZ 4" X 2" EM AÇO ESMALTADA					UN	41,00	6,01	246,47	-	-	0,00%	41,00	246,47	100,00%	41,00	246,47	100,00%			
19.2.7	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023					UN	1,00	9,06	9,06	-	-	0,00%	1,00	9,06	100,00%	1,00	9,06	100,00%			
19.2.8	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 38 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					UN	2,00	17,66	35,32	-	-	0,00%	2,00	35,32	100,00%	2,00	35,32	100,00%			
19.3	ACESSÓRIOS GERAL								12.744,47	-	-	0,00%		12.744,47	100,00%		12.744,47	100,00%			
19.3.1	ARRUELA EM ALUMINIO					UND	1.847,00	1,37	2.536,58	-	-	0,00%	1.847,00	2.536,58	100,00%	1.847,00	2.536,58	100,00%			
19.3.2	BUCHA DE NYLON					UND	17,00	0,72	12,29	-	-	0,00%	17,00	12,29	100,00%	17,00	12,29	100,00%			
19.3.3	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM					UND	1.155,00	0,73	848,77	-	-	0,00%	1.155,00	848,77	100,00%	1.155,00	848,77	100,00%			
19.3.4	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"					UND	1.739,00	0,88	1.529,32	-	-	0,00%	1.739,00	1.529,32	100,00%	1.739,00	1.529,32	100,00%			
19.3.5	SUORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE. POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023					M	201,00	24,82	4.988,16	-	-	0,00%	201,00	4.988,16	100,00%	201,00	4.988,16	100,00%			
19.3.6	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)					KG	256,00	8,87	2.269,84	-	-	0,00%	256,00	2.269,84	100,00%	256,00	2.269,84	100,00%			
19.3.7	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020					UN	1,00	15,58	15,58	-	-	0,00%	1,00	15,58	100,00%	1,00	15,58	100,00%			
19.3.8	ARMAÇAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR					KG	1,00	73,80	73,80	-	-	0,00%	1,00	73,80	100,00%	1,00	73,80	100,00%			
19.3.9	BLOCO DE ENGATE RÁPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025					UN	2,00	48,43	96,86	-	-	0,00%	2,00	96,86	100,00%	2,00	96,86	100,00%			
19.3.10	CABO DE COBRE NU 6 MM2 MEIO-DURO					M	2,20	10,65	23,43	-	-	0,00%	2,20	23,43	100,00%	2,20	23,43	100,00%			
19.3.11	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM					UN	1,00	42,21	42,21	-	-	0,00%	1,00	42,21	100,00%	1,00	42,21	100,00%			
19.3.12	CHUMBADOR DE AÇO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA					UN	1,00	23,18	23,18	-	-	0,00%	1,00	23,18	100,00%	1,00	23,18	100,00%			
19.3.13	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM					UN	5,00	18,21	91,07	-	-	0,00%	5,00	91,07	100,00%	5,00	91,07	100,00%			
19.3.14	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023					UN	1,00	145,92	145,92	-	-	0,00%	1,00	145,92	100,00%	1,00	145,92	100,00%			
19.3.15	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020					UN	1,00	13,24	13,24	-	-	0,00%	1,00	13,24	100,00%	1,00	13,24	100,00%			
19.3.16	PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM					UN	16,00	0,70	11,18	-	-	0,00%	16,00	11,18	100,00%	16,00	11,18	100,00%			
19.3.17	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM					UN	1,00	23,03	23,03	-	-	0,00%	1,00	23,03	100,00%	1,00	23,03	100,00%			
19.4	CABOS								85.537,86	-	-	0,00%		-	0,00%		-	0,00%			
19.4.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021					M	201,70	116,05	23.406,94	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
19.4.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020					M	46,80	69,31	3.243,53	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
19.4.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020					M	9,40	12,32	115,85	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
19.4.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021					M	37,50	28,83	1.081,06	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
19.4.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023					M	4.343,10	2,53	10.987,44	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
19.4.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023					M	463,10	13,28	6.148,00	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			



BM - BOLETIM DE MEDIÇÕES

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA
ENREREÇO: RUA SIMPLÍCIO MOREIRA, Nº 11,85, CENTRO - IMPERATRIZ-MA
CONTRATADA: CONSTRUTORA CAMPOS LTDA
CNPJ: 07.214.148-0001-78

CONTRATO: 20251201.CP.003/2025

MEDIÇÃO - 04

PERÍODO:

23/12/2025 a 23/02/2026

R\$

308.939,34

PERCENTUAL DE AVANÇO DO PERÍODO

7,21%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO TOTAL		
						QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%
19.4.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	127,90	19,25	2.462,21	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.4.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4.933,80	3,60	17.771,74	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.4.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	511,70	25,85	13.228,86	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.4.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	103,90	5,46	567,01	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.4.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	862,50	7,57	6.525,23	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.5	CAIXAS DE PASSAGEM				2.926,82	-	-	0,00%		2.926,82	100,00%		2.926,82	100,00%
19.5.1	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	3,00	21,60	64,80	-	-	0,00%	3,00	64,80	100,00%	3,00	64,80	100,00%
19.5.2	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X "100" MM	UN	2,00	35,88	71,75	-	-	0,00%	2,00	71,75	100,00%	2,00	71,75	100,00%
19.5.3	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	14,00	199,30	2.790,27	-	-	0,00%	14,00	2.790,27	100,00%	14,00	2.790,27	100,00%
19.6	DISPOSITIVOS ELÉTRICOS				9.696,51	-	-	0,00%		-	0,00%		-	0,00%
19.6.1	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	38,10	190,52	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.6.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	31,35	282,12	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.6.3	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	47,87	191,50	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.6.4	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	64,38	64,38	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.6.5	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	30,00	14,26	427,91	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.6.6	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	30,00	11,59	347,68	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.6.7	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	27,00	53,32	1.439,63	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.6.8	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	14,00	60,13	841,77	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.6.9	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	54,57	54,57	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.6.10	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	69,84	488,85	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.6.11	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	135,00	36,85	4.974,97	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.6.12	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	39,26	392,61	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.7	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO				5.275,14	-	-	0,00%		-	0,00%		-	0,00%
19.7.1	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	45,66	182,63	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.7.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	56,00	8,35	467,52	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.7.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	13,00	8,35	108,53	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.7.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	13,00	10,25	133,28	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ



BM - BOLETIM DE MEDIÇÕES

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA ENREREÇO: RUA SIMPLÍCIO MOREIRA, Nº 11,85, CENTRO - IMPERATRIZ-MA CONTRATADA: CONSTRUTORA CAMPOS LTDA CNPJ: 07.214.148-0001-78						MEDIÇÃO - 04													
						CONTRATO: 20251201.CP.003/2025						PERÍODO: 23/12/2025 a 23/02/2026		VALOR DA MEDIÇÃO			PERCENTUAL DE AVANÇO DO PERÍODO		
														R\$ 308.939,34			7,21%		
														ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL		
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%					
19.7.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6,00	11,85	71,13	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%					
19.7.6	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	282,57	282,57	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%					
19.7.7	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	45,66	91,32	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%					
19.7.8	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	410,57	410,57	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%					
19.7.9	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	51,38	102,76	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%					
19.7.10	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	56,04	112,08	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%					
19.7.11	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6,00	112,31	673,88	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%					
19.7.12	DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 8 KA	UN	36,00	48,79	1.756,45	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%					
19.7.13	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30MA	UN	3,00	110,06	330,18	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%					
19.7.14	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30MA	UN	1,00	110,13	110,13	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%					
19.7.15	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 30MA	UN	2,00	118,23	236,46	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%					
19.7.16	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 80A - 30MA	UN	1,00	205,65	205,65	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%					
19.8	ELETROCALHAS				36.134,20	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%					
19.8.1	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 75MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	121,00	180,38	21.825,86	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%					
19.8.2	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	105,30	109,75	11.556,44	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%					
19.8.3	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO	UND	92,00	12,90	1.187,01	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%					
19.8.4	TÊ HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	105,66	316,99	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%					
19.8.5	TÊ HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	92,99	278,97	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%					
19.8.6	TÊ HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	108,74	652,41	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%					
19.8.7	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	UND	1,00	82,27	82,27	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%					
19.8.8	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD	UN	4,00	24,93	99,70	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%					
19.8.9	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD	UN	8,00	16,82	134,54	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%					
19.9	ELETRODUTOS				28.351,05	-	-	0,00%		12.335,77	43,51%		12.335,77	43,51%					
19.9.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	46,80	20,70	968,60	-	-	0,00%	46,80	968,60	100,00%	46,80	968,60	100,00%					
19.9.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.611,40	9,94	25.954,02	-	-	0,00%	1.000,00	9.938,74	38,29%	1.000,00	9.938,74	38,29%					
19.9.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	17,20	6,73	115,83	-	-	0,00%	17,20	115,83	100,00%	17,20	115,83	100,00%					
19.9.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	59,30	14,38	852,97	-	-	0,00%	59,30	852,97	100,00%	59,30	852,97	100,00%					
19.9.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (5"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	17,10	19,68	336,61	-	-	0,00%	17,10	336,61	100,00%	17,10	336,61	100,00%					
19.9.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,00	11,47	22,94	-	-	0,00%	2,00	22,94	100,00%	2,00	22,94	100,00%					
19.9.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,00	16,83	33,66	-	-	0,00%	2,00	33,66	100,00%	2,00	33,66	100,00%					
19.9.8	ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO LEVE, DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	2,20	30,19	66,42	-	-	0,00%	2,20	66,42	100,00%	2,20	66,42	100,00%					



BM - BOLETIM DE MEDIÇÕES

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA
ENREREÇO: RUA SIMPLICIO MOREIRA, Nº 11,85, CENTRO - IMPERATRIZ-MA
CONTRATADA: CONSTRUTORA CAMPOS LTDA
CNPJ: 07.214.148-0001-78

CONTRATO: 20251201.CP.003/2025

MEDIÇÃO - 04

PERÍODO:

23/12/2025 a 23/02/2026

VALOR DA MEDIÇÃO

R\$ 308.939,34

PERCENTUAL DE AVANÇO DO PERÍODO

7,21%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO TOTAL		
						QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%
19.10	PERFILADOS				5.185,61	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.10.1	GANCHO PARA PERFILADO 44X32 MM	M	53,00	28,24	1.496,62	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.10.2	SUORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023	M	44,90	21,52	966,06	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.10.3	PERFILADO PERFURADO 38X38 MM	M	44,90	60,64	2.722,93	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.11	ILUMINAÇÃO				34.114,69	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.11.1	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 18 W	UN	14,00	54,24	759,30	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.11.2	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 31 W	UN	89,00	135,12	12.025,56	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.11.3	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 39 W	UN	125,00	135,12	16.889,83	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.11.4	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	UN	6,00	31,88	191,26	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.11.5	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUORTE E ALÇA, COM LÂMPADA LED DE 200 W	UN	5,00	149,86	749,32	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.11.6	LUMINÁRIA TIPO SPOT BALIZADOR LED 12W	UN	9,00	153,49	1.381,41	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.11.7	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	17,00	124,59	2.118,02	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.12	QUADROS				8.676,00	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.12.1	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	89,41	89,41	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19.12.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00	1.073,32	8.586,59	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
20	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO				81.379,30	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
20.1	ACESSÓRIOS CABEAMENTO				15.222,70	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
20.1.1	SWITCH TIPO 48 PORTAS	UN	1,00	5.963,13	5.963,13	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
20.1.2	PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES.	UN	48,00	63,01	3.024,27	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
20.1.3	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	3,00	1.374,92	4.124,76	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
20.1.4	RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 10 TOMADAS, PADRÃO RACK 19"	UN	1,00	170,61	170,61	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
20.1.5	GUIA DE CABOS FECHADO 1U	UN	2,00	36,48	72,96	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
20.1.6	BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"	UN	1,00	138,26	138,26	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
20.1.7	RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	1,00	1.687,79	1.687,79	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
20.1.8	GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS	UN	1,00	40,92	40,92	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
20.2	ACESSÓRIOS				5.560,90	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
20.2.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	42,00	11,00	461,95	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
20.2.2	ARRUELA EM ALUMÍNIO	UND	697,00	1,37	957,23	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
20.2.3	BUCHA DE NYLON	UND	23,00	0,72	16,62	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
20.2.4	PARAFUSO EM AÇO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA	UND	481,00	3,16	1.518,18	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
20.2.5	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	UND	593,00	0,88	521,50	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
20.2.6	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	39,24	7,81	306,32	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
20.2.7	SUORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	65,00	27,37	1.779,09	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
20.3	CAIXAS E QUADROS				3.801,97	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
20.3.1	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	UN	5,00	340,41	1.702,05	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
20.3.2	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	4,00	256,65	1.026,59	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
20.3.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	1.073,32	1.073,32	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
20.4	DISPOSITIVOS				2.069,43	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
20.4.1	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	28,00	59,92	1.677,80	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
20.4.2	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	27,97	391,62	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%



BM - BOLETIM DE MEDIÇÕES

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA
ENREFEÇO: RUA SIMPLICIO MOREIRA, Nº 11,85, CENTRO - IMPERATRIZ-MA
CONTRATADA: CONSTRUTORA CAMPOS LTDA
CNPJ: 07.214.148-0001-78

CONTRATO: 20251201.CP.003/2025

MEDIÇÃO - 04

PERÍODO:

23/12/2025 a 23/02/2026

VALOR DA MEDIÇÃO

R\$ 308.939,34

PERCENTUAL DE AVANÇO DO PERÍODO

7,21%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO TOTAL		
						QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%
20.5	ELETROCALHA E ELETRODUTOS				18.892,44		-	0,00%		-	0,00%		-	0,00%
20.5.1	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	77,60	139,12	10.795,57	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
20.5.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4,20	20,70	86,93	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
20.5.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	258,40	17,05	4.404,80	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
20.5.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	51,80	16,03	830,59	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
20.5.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	46,90	35,78	1.678,06	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
20.5.6	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"	UND	1,00	193,69	193,69	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
20.5.7	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	UND	3,00	82,27	246,81	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
20.5.8	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO	UND	12,00	12,90	154,83	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
20.5.9	TERMINAL A COMPRESSÃO	UN	5,00	17,95	89,75	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
20.5.10	TÉ HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	102,86	411,43	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
20.6	CABEAMENTO				35.831,86		-	0,00%		-	0,00%		-	0,00%
20.6.1	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	6.209,50	5,77	35.831,86	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
21	INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)				38.252,45		-	0,00%		-	0,00%		-	0,00%
21.1	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	15,00	37,84	567,59	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
21.2	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	15,00	97,88	1.468,22	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
21.3	TERMINAL AÉREO EM BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 300 MM	M	60,00	27,43	1.645,85	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
21.4	BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 7/8" X 1/8"	UN	300,00	36,15	10.845,87	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
21.5	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	550,00	42,18	23.197,01	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
21.6	BARRA RE-BAR REDONDA AÇO GALVANIZADO 80MM2	UN	20,00	26,39	527,90	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO				71.645,95		-	0,00%		-	0,00%		-	0,00%
22.1	EXTINTORES				2.137,42		-	0,00%		-	0,00%		-	0,00%
22.1.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	8,00	233,22	1.865,74	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.1.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	1,00	271,68	271,68	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.2	HIDRANTES				8.248,15		-	0,00%		-	0,00%		-	0,00%
22.2.1	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	2.183,79	4.367,57	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.2.2	HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	3.880,58	3.880,58	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.3	ACESSÓRIOS				28.893,88		-	0,00%		-	0,00%		-	0,00%
22.3.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	136,07	272,14	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.3.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	235,61	235,61	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.3.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	286,09	1.144,36	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.3.4	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	397,08	397,08	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.3.5	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	792,08	1.584,15	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%



BM - BOLETIM DE MEDIÇÕES

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA

ENREREÇO: RUA SIMPLÍCIO MOREIRA, Nº 11,85, CENTRO - IMPERATRIZ-MA

CONTRATADA: CONSTRUTORA CAMPOS LTDA

CNPJ: 07.214.148-0001-78

CONTRATO: 20251201.CP.003/2025

MEDIÇÃO - 04

PERÍODO:

23/12/2025 a 23/02/2026

VALOR DA MEDIÇÃO

R\$ 308.939,34

PERCENTUAL DE AVANÇO DO PERÍODO

7,21%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO TOTAL		
						QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%
22.3.6	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	1.091,21	2.182,43	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.3.7	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	366,00	732,00	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.3.8	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	199,67	199,67	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.3.9	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	50,03	100,06	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.3.10	MOTO BOMBA 5.00 CV - VAZÃO 12.0 M³/H - PRESSÃO 15 MCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	4.376,75	8.753,51	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.3.11	PRESSOSTATO	UN	3,00	627,45	1.882,36	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.3.12	TÂNQUE DE PRESSÃO PWB-24LX	UN	1,00	669,11	669,11	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.3.13	VÁLVULA DE ALÍVIO COM MOLA 2"	UN	1,00	4.021,77	4.021,77	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.3.14	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2,00	2.637,43	5.274,85	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.3.15	BOMBA JOCKEY IP-21 BT4 60HZ, PRESSÃO 15 MCA - VAZÃO 1,23 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.444,78	1.444,78	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.4	TUBULAÇÕES E CONEXÕES				24.939,02	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.4.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	0,54	51,48	27,80	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.4.2	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	0,22	63,67	14,01	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.4.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	1,51	73,39	110,82	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.4.4	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	0,33	102,86	33,94	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.4.5	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	97,54	126,65	12.353,40	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.4.6	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	8,06	167,99	1.354,04	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.4.7	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	30,67	30,67	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.4.8	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00	55,91	279,55	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.4.9	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	22,00	83,06	1.827,40	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.4.10	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	11,00	111,17	1.222,86	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.4.11	BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"	UN	5,00	16,36	81,80	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.4.12	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	39,79	198,96	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.4.13	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	66,03	66,03	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.4.14	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 X 25 MM (1 1/2" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	89,61	179,21	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.4.15	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	269,72	269,72	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.4.16	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 75 X 65 MM, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	349,98	349,98	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.4.17	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	292,63	877,90	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.4.18	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	323,44	646,87	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%

BM - BOLETIM DE MEDIÇÕES

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA
ENREREÇO: RUA SIMPLÍCIO MOREIRA, Nº 11,85, CENTRO - IMPERATRIZ-MA
CONTRATADA: CONSTRUTORA CAMPOS LTDA
CNPJ: 07.214.148-0001-78

CONTRATO: 20251201.CP.003/2025

MEDIÇÃO - 04

VALOR DA MEDIÇÃO

PERCENTUAL DE AVANÇO DO PERÍODO

PERÍODO:

23/12/2025 a 23/02/2026

R\$

308.939,34

7,21%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO TOTAL		
						QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%
22.4.19	LUIVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	354,25	708,51	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.4.20	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	72,63	217,89	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.4.21	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1"	UN	1,00	84,71	84,71	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.4.22	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1"	UN	2,00	193,90	387,79	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.4.23	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2	UN	1,00	193,90	193,90	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.4.24	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2"	UN	2,00	198,86	397,72	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.4.25	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	226,93	453,86	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.4.26	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	289,34	1.157,37	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.4.27	ADAPTADOR PARA MANÔMETRO	UN	1,00	98,39	98,39	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.4.28	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	43,65	17,75	774,58	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.4.29	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	5,00	32,51	162,57	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.4.30	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	17,32	86,62	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.4.31	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	UN	5,00	21,30	106,50	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.4.32	LUIVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	8,78	43,91	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.4.33	ADAPTADOR PARA CONDULETE 25MM	UN	9,00	15,53	139,76	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.5	SINALIZAÇÕES				7.427,48	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.5.1	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	36,00	21,05	757,66	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.5.2	SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA.	UN	101,00	55,56	5.611,62	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.5.3	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	M2	12,00	88,18	1.058,20	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
23	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO				36.015,22	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
23.1	DUTOS				31.655,73	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
23.1.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	450,87	3,98	1.792,43	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
23.1.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	620,34	5,79	3.594,61	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
23.1.3	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	16,90	38,35	648,04	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
23.1.4	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	154,90	68,97	10.683,27	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
23.1.5	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	138,00	108,24	14.937,38	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
23.2	DRENO				4.359,50	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
23.2.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	128,80	27,80	3.581,20	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
23.2.2	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	24,00	17,54	420,97	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
23.2.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	19,00	17,48	332,12	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
23.2.4	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	25,20	25,20	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
24	INSTALAÇÕES DE EXAUSTÃO MECÂNICA				8.158,72	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ



BM - BOLETIM DE MEDIÇÕES

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA ENREREÇO: RUA SIMPLÍCIO MOREIRA, Nº 11,85, CENTRO - IMPERATRIZ-MA CONTRATADA: CONSTRUTORA CAMPOS LTDA CNPJ: 07.214.148-0001-78						CONTRATO: 20251201.CP.003/2025			MEDIÇÃO - 04							
									PERÍODO:	23/12/2025 a 23/02/2026	VALOR DA MEDIÇÃO			PERCENTUAL DE AVANÇO DO PERÍODO		
											R\$ 308.939,34			7,21%		
											ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL		
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%		
24.1	INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR	UN	4,00	552,20	2.208,78	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%		
24.2	DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR	M	7,70	72,70	559,82	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%		
24.3	COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM	UN	1,00	5.390,12	5.390,12	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%		
25	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				128.860,36	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%		
25.1	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	UN	1,00	20.515,77	20.515,77	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%		
25.2	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	64,53	909,48	58.689,05	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%		
25.3	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	135,60	226,52	30.715,96	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%		
25.4	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	301,00	36,55	11.001,69	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%		
25.5	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M	M2	5,44	620,24	3.374,09	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%		
25.6	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,50M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. AF_03/2024	M	3,15	1.448,83	4.563,80	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%		
26	SERVIÇOS FINAIS				96.466,49	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%		
26.1	LIMPEZA GROSSA DE OBRA	M2	4.500,00	13,89	62.505,62	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%		
26.2	LIMPEZA FINA DE OBRA	M2	4.500,00	7,18	32.309,93	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%		
26.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX - 500 X 700 MM	UN	1,00	1.650,95	1.650,95	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%		
TOTAL DO CONTRATO						4.282.427,00			1.915.217,34 44,72%			308.939,34 2.224.156,68 51,94%				

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

LOCAL: RUA SIMPLICIO MOREIRA, Nº 1185

BAIRRO: CENTRO, IMPERATRIZ - MA


CONTRATO Nº: 20251201.CP.003/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA


CONSTRUTORA: CONSTRUTORA CAMPOS LTDA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 23/12/2025 a 23/02/2026


DATA: 22/07/2026

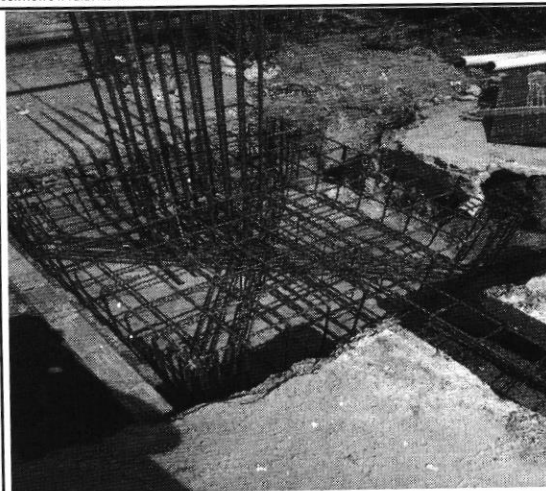


EXECUÇÃO BLOCOS DE FUNDAÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO

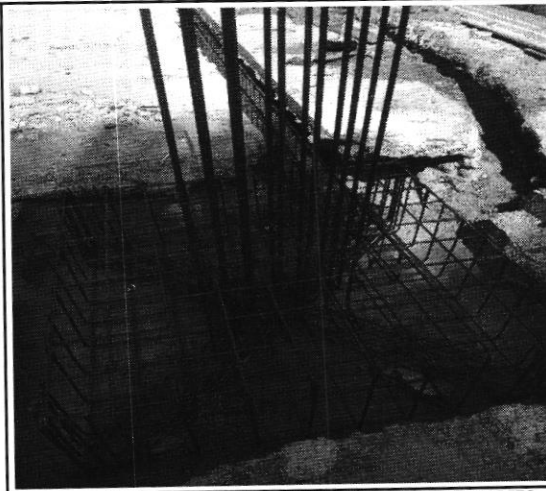


EXECUÇÃO BLOCOS DE FUNDAÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO

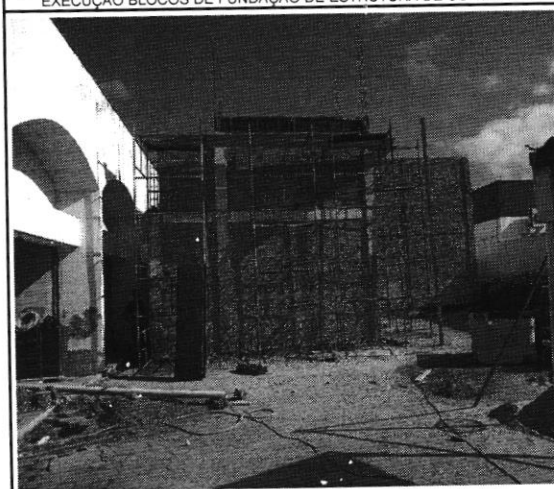


EXECUÇÃO DE PAREDES E ESTRUTURA DE CONCRETO

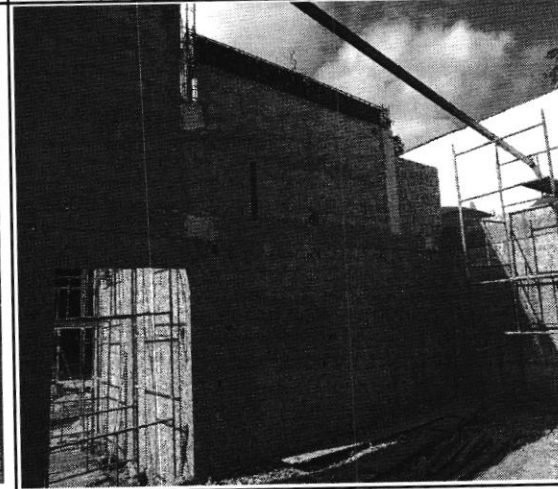

EXECUÇÃO DE PAREDES E ESTRUTURA DE CONCRETO

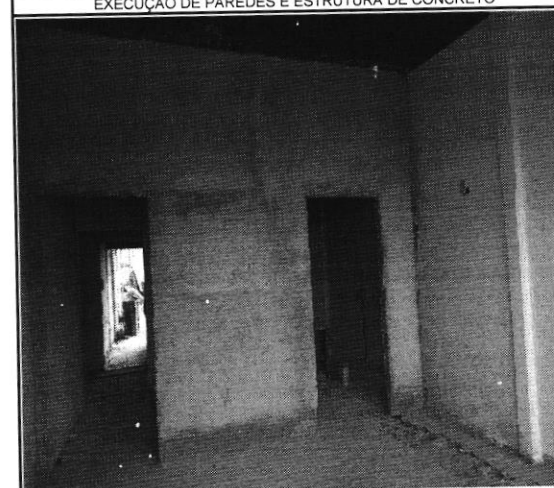

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDES - REBOCO

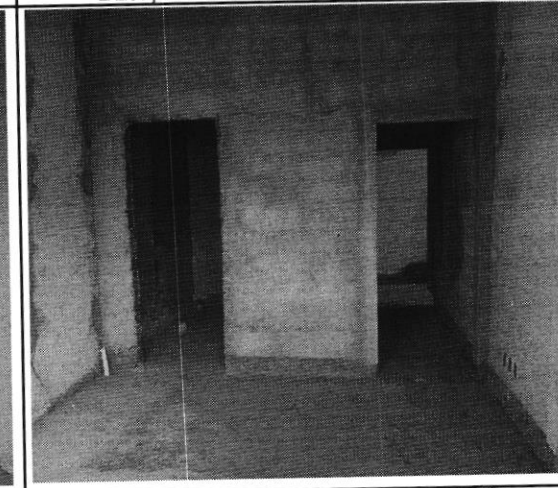

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDES - REBOCO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE: CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

LOCAL: RUA SIMPLICIO MOREIRA, Nº 1185

BAIRRO: CENTRO, IMPERATRIZ - MA


CONTRATO Nº: 20251201 CP.003/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA


CONSTRUTORA: CONSTRUTORA CAMPOS LTDA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 23/12/2025 à 23/02/2026

DATA: 22/07/2026

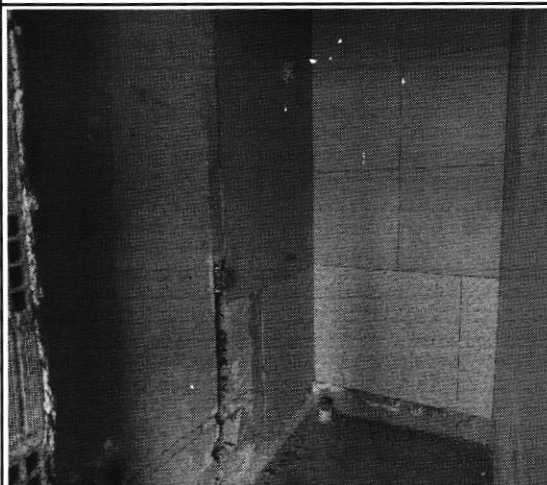

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTOS INTERNOS DE PAREDE

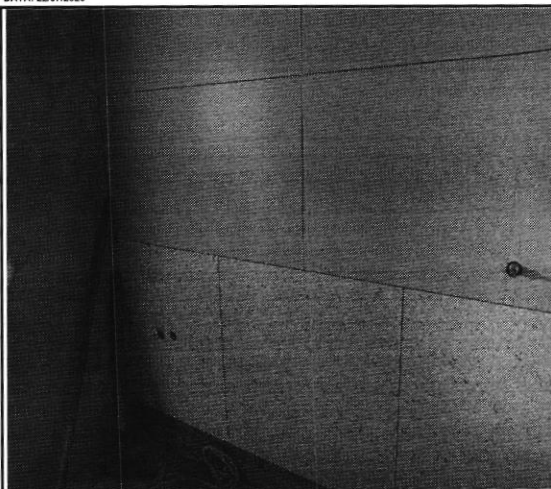


EXECUÇÃO DE REVESTIMENTOS INTERNOS DE PAREDE




EXECUÇÃO DE PINTURA EM PAREDES



EXECUÇÃO DE PINTURA EM PAREDES

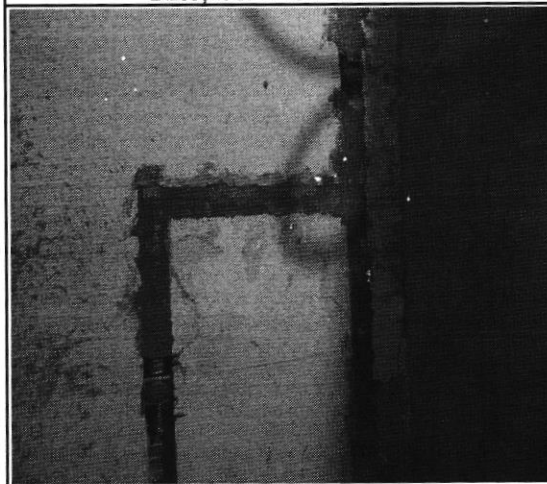

INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

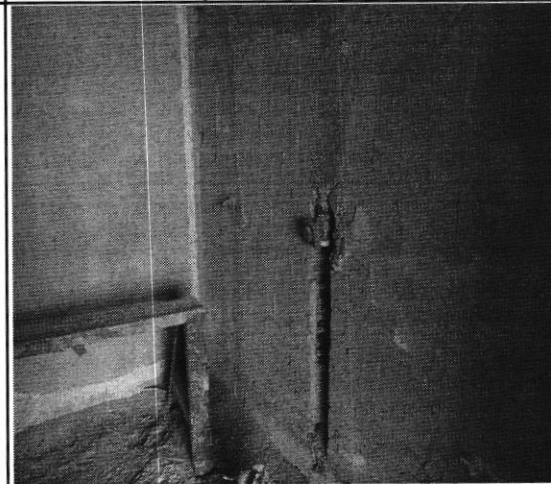

INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE: CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

LOCAL: RUA SIMPLICIO MOREIRA, Nº 1185

BAIRRO: CENTRO, IMPERATRIZ - MA

CONTRATO Nº: 20251201.CP.003/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA

CONSTRUTORA: CONSTRUTORA CAMPOS LTDA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 23/12/2025 à 23/02/2026

DATA: 22/07/2026



INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS



INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS




INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS ELÉTRICOS



INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS ELÉTRICOS



EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO

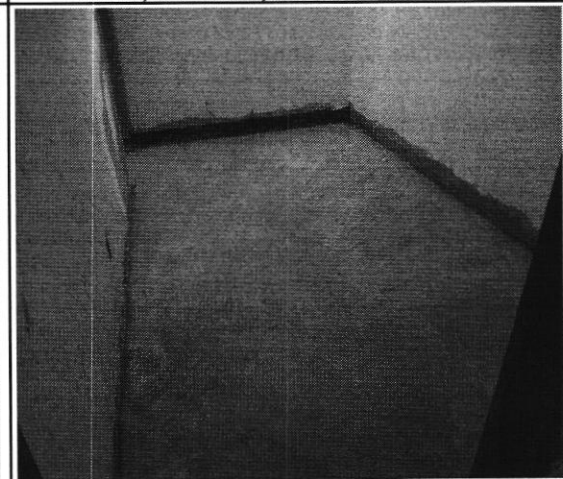

EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0644 / 3703 / 000575276881-7**Conta destino:** 0644 / 1292 / 000577578322-7**Nome destinatário:** CONSTRUTORA CAMPOS LTDA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 301.524,80**Data de débito:** 04/08/2026**Data/hora da operação:** 04/08/2026 15:10:34**Código da operação:** 217923742**Chave de segurança:** XHU1JSHEPGHEWMEH**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104
